WORKS RELATED TO THE REHABILITATION OF RUSKI, KOMATEVSKO AND SHESTI SEPTEMVRI BOULEVARDS AND TO THE COMPLETION OF SEVEREN BOULEVARD

STRABAG TEAMS WORK.

ID	Construction and non-construction activities	Строителни и нестроителни дейности	Ед.м.	Общо колич.	Произв.	Календ. дни	Начална дата	Finish	Cost
1	**Works related to the rehabilitation of Ruski, Komatevsko and Shesti Septemvri Boulevards and to the completion of Severen Boulevard, Plovdiv,Bulgaria**	**Рехабилитация на булевардите Руски, Коматевско шосе и Шести септември и доизграждане на бул Северен, Пловдив,**		0		1095 dys	Mon 18.7.16	Wed 17.7.19	0,00 лв.
2	**Stage 1 - INITIAL / PRELIMINARY ACTIVITIES**	**Фаза 1 - Начало / Предварителни дейности**		0		42 dys	Mon 18.7.16	Sun 28.8.16	0,00 лв.
3	Commencement Date	Дата на започване		0		0 dys	Mon 18.7.16	Mon 18.7.16	0,00 лв.
4	Traffic Management Plan	Проект за ВОБД		0		0 dys	Sun 14.8.16	Sun 14.8.16	0,00 лв.
5	Possession of the Site given to the Contractor together with permissions required for the commencement of the Works	Осигуряване на достъп до обекта на Изпълнителя заедно с разрешенията, необходими за започване на строителните работи		0		0 dys	Sun 14.8.16	Sun 14.8.16	0,00 лв.
6	Detailed Program of Works	Подробна Работна програма		0		0 dys	Mon 1.8.16	Mon 1.8.16	0,00 лв.
7	Plan on Health and Safety	План по безопасност и здраве		0		0 dys	Fri 5.8.16	Fri 5.8.16	0,00 лв.
8	Quality Assurance and Control system	Система за контрол на качеството		0		0 dys	Fri 12.8.16	Fri 12.8.16	0,00 лв.
9	Mobilization plan	План за мобилизация		0		0 dys	Sun 14.8.16	Sun 14.8.16	0,00 лв.
10	Contractor's Environmental Management Plan	План за опазване на околната среда на Изпълнителя		0		0 dys	Sun 28.8.16	Sun 28.8.16	0,00 лв.
11	**Stage 2 - CONSTRUCTION WORKS**	**Фаза 2 - Строителни работи**		0		1082 dys	Sun 31.7.16	Wed 17.7.19	26 520 036,76 лв.
12	**Construction works of Ruski Blvd**	**Строителни работи на бул"Руски"**		0		717 dys	Sun 31.7.16	Tue 17.7.18	5 805 756,19 лв.
13	**Overhaul of Ruski Blvd in the section from the Central Station intersection to Shesti Septemvri Project / Blvd / /Section 1 (from Central Station intersection to W. Gladstone Str. - West lane)**	**Оновен ремонт на бул"Руски" в участъка от кръстовище Централна гара до бул"Шести септември" /Участък 1 (от кръстовище Централна гара до улица У. Гладстоун - западно платно)/**	Етап 1	0		224 dys	Sun 31.7.16	Sat 11.3.17	1 425 802,64 лв.
14	**Main Road**			0		224 dys	Sun 31.7.16	Sat 11.3.17	1 425 802,64 лв.
15	**BILL B1 / СМЕТКА B1 EARTH WORKS /**	**ЗЕМНИ РАБОТИ**		0		224 dys	Sun 31.7.16	Sat 11.3.17	1 425 802,64 лв.
16	Notice of initiation and project for traffic	Известие за започване и проект за ВОД		0	0	0 dys	Sun 31.7.16	Sun 31.7.16	0,00 лв.
17	Acess to the site	Допуск до работната площадка		0		0 dys	Sat 13.8.16	Sat 13.8.16	0,00 лв.
18	TTO	Пътни знаци и ВОД	pcs	1		3 dys	Sun 14.8.16	Tue 16.8.16	8 261,65 лв.
19	Demolition asphalt concrete pavement	Разваляне на асфалтобетонова настилка	m2	5906,95	492,25	12 dys	Wed 17.8.16	Sun 28.8.16	21 872,70 лв.
20	Demounting of road signs and posts	Демонтаж на пътни знаци и стълбове	pcs	60	30	2 dys	Wed 17.8.16	Thu 18.8.16	17 746,72 лв.
21	Removal of sidewalk pavement	Премахване на тротоарна настилка	m2	2255,07	250,56	9 dys	Fri 19.8.16	Sat 27.8.16	14 125,70 лв.
22	Removal of street curbs	Премахване на улични бордюри	m	1386,5	154,06	9 dys	Fri 19.8.16	Sat 27.8.16	13 780,25 лв.
23	Pipe channel network and moving of existing equipment including sidewalks	ТКМ и преместване на ел. Оборудване включително в тротоари	m	650		38 dys	Mon 29.8.16	Wed 5.10.16	355 838,45 лв.
24	Removal of manholes and new installation	Премахване на ревизионни шахти и нов монтаж	pcs	45	5	9 dys	Fri 19.8.16	Sat 27.8.16	19 893,27 лв.
25	Excavation works	Изкопни работи	m3	5139,25	256,96	20 dys	Sun 28.8.16	Fri 16.9.16	46 144,87 лв.
26	Profiling and strengthening of the earth bed	Профилиране и усилване на земното легло	m2	5820	970	6 dys	Sat 17.9.16	Thu 22.9.16	7 755,05 лв.
27	Replacing of stopcocks	Подмяна на спирателни кранове	pcs	9	3	3 dys	Fri 23.9.16	Sun 25.9.16	4 954,80 лв.
28	**BILL B2 / СМЕТКА B2 ROAD WORKS /**	**ПЪТНИ РАБОТИ**		0	0	152 dys	Sat 1.10.16	Wed 1.3.17	592 693,58 лв.
29	Crushed stone for roadway	Трошен камък за пътно платно	m3	4736,6	278,62	17 dys	Sat 1.10.16	Mon 17.10.16	145 421,56 лв.
30	Delivery and placing of concrete curbs 18/35	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35	m	1354,25	112,85	12 dys	Tue 18.10.16	Sat 29.10.16	44 745,60 лв.
31	Drainage chutes at crosswalks	Отводнителни улеи при пешеходни пътеки	m	37,5	12,5	3 dys	Mon 27.2.17	Wed 1.3.17	16 073,08 лв.
32	Test area for bituminous stone	Пробен участък за битумизиран камък		0	0	3 dys	Wed 23.11.16	Fri 25.11.16	0,00 лв.
33	Asphalt mixture laying	Битуминизиран трошен камък	m3	873	218,25	4 dys	Thu 1.12.16	Sun 4.12.16	224 762,20 лв.
34	Test section	Пробен участък за неплътен асфалт		0	0	2 dys	Mon 5.12.16	Tue 6.12.16	0,00 лв.
35	Asphalt laying on the road - Binder	Доставка и полагане на асфалтова смес - Неплътен асфалтобетон	t	838,25	419,13	2 dys	Wed 14.12.16	Thu 15.12.16	94 135,65 лв.
36	Uni pavement and tactile tiles	Уни паваж и тактилни плочи	m2	1611,16	161,12	10 dys	Sat 28.1.17	Mon 6.2.17	62 600,69 лв.
37	Fire hydrant	Противопожарен хидрант		0	0	4 dys	Tue 7.2.17	Fri 10.2.17	4 954,80 лв.
38	**BILL B3 / СМЕТКА B3 ROAD EQUIPMENT /**	**ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**		0		128 dys	Tue 25.10.16	Wed 1.3.17	129 757,30 лв.
39	Building of cable routes for traffic lights	Изграждане на кабелни трасета за светофарни уредби	lump	1	0,05	20 dys	Wed 9.11.16	Mon 28.11.16	22 577,37 лв.
40	Traffic and pedestrians lights and controllers	Светофари за пешеходно и автомобилно движение и (	pcs	38	3,8	10 dys	Mon 20.2.17	Wed 1.3.17	58 417,05 лв.
41	Delivery and mounting of pipe-lattice railing	Тръбно-решетъчен парапет с монтиране	m	77,5	25,83	3 dys	Tue 7.2.17	Thu 9.2.17	8 333,53 лв.
42	Mounting of bus shelters with lighting	Монтаж на навеси, на спирки с осветление	pcs	1	0,25	4 dys	Fri 10.2.17	Mon 13.2.17	10 074,64 лв.
43	Street-tidies and benches	Кошчета за боклук и пейки и стълбчета	pcs	339	48,43	7 dys	Tue 14.2.17	Mon 20.2.17	24 893,12 лв.
44	Construction of cable routes	Изграждане на кабелни трасета /за осветление/	lump	0	0	10 dys	Tue 25.10.16	Thu 3.11.16	1 820,53 лв.
45	Installation of poles	Монтаж на стълбове	lump	0	0	5 dys	Mon 23.1.17	Fri 27.1.17	1 820,53 лв.
46	Installation of poles	Монтаж на кабели и осветителни тела	lump	0	0	5 dys	Sat 28.1.17	Wed 1.2.17	1 820,53 лв.
47	**Pedestrian and bicycle road**	**ПЕШЕХОДЕН И ВЕЛОСИПЕДЕН ПЪТ**		0		116 dys	Sun 14.8.16	Wed 7.12.16	192 978,30 лв.
48	Removal of plates	Премахване на плочи	m2	2535,31	126,77	20 dys	Sun 14.8.16	Fri 2.9.16	15 409,15 лв.
49	Removal of garden curbs	Премахване на градински бордюри	m	1227,5	245,5	5 dys	Mon 15.8.16	Fri 19.8.16	12 635,45 лв.
50	Excavation works	Изкопни работи	m3	683	170,75	4 dys	Sat 3.9.16	Tue 6.9.16	9 424,45 лв.
51	Pipe channel network and moving of existing equipment including sidewalks	ТКМ и преместване на ел. Оборудване включително в тротоари	m	500	50	10 dys	Wed 7.9.16	Fri 16.9.16	38 922,45 лв.
52	Crushed stone	Трошен камък	m3	390	97,5	4 dys	Sat 17.9.16	Tue 20.9.16	15 458,45 лв.
53	New garden curbs in the central reserve (8/16/50)	Нови градински бордюри в разделителната ивица (8/16/50)	m	1216	29,66	41 dys	Sat 1.10.16	Thu 10.11.16	17 769,29 лв.
54	Unipavage	Унипаваж	m2	1950	97,5	20 dys	Fri 11.11.16	Wed 30.11.16	77 897,45 лв.
55	Park lights	Парково осветление	lump	0	0	7 dys	Thu 1.12.16	Wed 7.12.16	5 461,61 лв.
56	Cleaning of the site	Почистване на площадката		0	0	10 dys	Thu 2.3.17	Sat 11.3.17	0,00 лв.
57	Prepare for temporary traffic operation	Подготовка за трафик		0	0	0 dys	Mon 6.2.17	Mon 6.2.17	0,00 лв.
58	**Overhaul of Ruski Blvd in the section from the Central Station intersection to Shesti Septemvri Project / Blvd / /Section 2 (from W. Gladstone Str. to finish object - East lane)/**	**Оновен ремонт на бул"Руски" в участъка от кръстовище Централна гара до бул"Шести септември" /Участък 2 (от ул. У. Гладстоун до край обект - източно платно)/**	Етап 2	0	0	174 dys	Tue 24.1.17	Sun 16.7.17	1 433 299,47 лв.
59	**Main Road**			0		164 dys	Tue 24.1.17	Thu 6.7.17	1 240 321,17 лв.
60	**BILL B1 / СМЕТКА B1 EARTH WORKS /**	**ЗЕМНИ РАБОТИ**		0		93 dys	Tue 24.1.17	Wed 26.4.17	545 497,68 лв.
61	Notice of initiation and project for traffic	Известие за започване и проект за ВОД		0	0	0 dys	Tue 24.1.17	Tue 24.1.17	0,00 лв.
62	Acess to the site	Допуск до работната площадка		0		0 dys	Mon 6.2.17	Mon 6.2.17	0,00 лв.
63	TTO	Пътни знаци и ВОД		0	0	3 dys	Tue 7.2.17	Thu 9.2.17	8 261,65 лв.
64	Demolition asphalt concrete pavement	Разваляне на асфалтобетонова настилка	m2	5906,95	393,8	15 dys	Fri 10.2.17	Fri 24.2.17	21 872,70 лв.
65	Demounting of road signs and posts	Демонтаж на пътни знаци и стълбове	pcs	60	30	1 dy	Fri 10.2.17	Fri 10.2.17	17 746,72 лв.
66	Removal of street curbs	Премахване на улични бордюри	m	1386,5	92,43	15 dys	Sat 11.2.17	Sat 25.2.17	13 780,25 лв.
67	Removal of sidewalk pavement	Премахване на тротоарна настилка	m2	2255,07	150,34	15 dys	Sat 11.2.17	Sat 25.2.17	14 125,70 лв.
68	Pipe channel network and moving of existing equipment including sidewalks	ТКМ и преместване на ел. Оборудване включително в тротоари	m	650		60 dys	Sun 26.2.17	Wed 26.4.17	390 962,67 лв.
69	Removal of manholes and new installation	Премахване на ревизионни шахти и нов монтаж	pcs	45	1,8	25 dys	Sat 11.2.17	Tue 7.3.17	19 893,27 лв.
70	Excavation works	Изкопни работи	m3	5139,25	205,57	25 dys	Wed 8.3.17	Sat 1.4.17	46 144,87 лв.
71	Completion of pipeline	Приключване на водопровод		0	0	0 dys	Sat 1.4.17	Sat 1.4.17	0,00 лв.
72	Profiling and strengthening of the earth bed	Профилиране и усилване на земното легло	m2	5820	970	6 dys	Sun 2.4.17	Fri 7.4.17	7 755,05 лв.
73	Replacing of stopcocks and fire hydrants	Подмяна на спирателни кранове	pcs	9	3	3 dys	Sun 2.4.17	Tue 4.4.17	4 954,80 лв.
74	**BILL B2 / СМЕТКА B2 ROAD WORKS /**	**ПЪТНИ РАБОТИ**		0	0	77 dys	Tue 18.4.17	Mon 3.7.17	592 693,58 лв.
75	Crushed stone for roadway	Трошен камък за пътно платно	m3	4736,6	236,83	20 dys	Tue 18.4.17	Sun 7.5.17	145 421,56 лв.
76	Delivery and placing of concrete curbs 18/35	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35	m	1354,25	67,71	20 dys	Mon 8.5.17	Sat 27.5.17	44 745,60 лв.
77	Drainage chutes at crosswalks	Отводнителни улеи при пешеходни пътеки	m	37,5	6,25	6 dys	Sun 28.5.17	Fri 2.6.17	16 073,08 лв.
78	Asphalt mixture laying	Битуминизиран трошен камък	m3	873	145,5	6 dys	Sat 3.6.17	Thu 8.6.17	224 762,20 лв.
79	Asphalt laying on the road - Binder	Доставка и полагане на асфалтова смес - Неплътен асфалтобетон	t	838,25	139,71	6 dys	Fri 9.6.17	Wed 14.6.17	94 135,65 лв.
80	Uni pavement and tactile tiles	Уни паваж и тактилни плочи	m2	1611,16	107,41	15 dys	Thu 15.6.17	Thu 29.6.17	62 600,69 лв.
81	Fire hydrant	Противопожарен хидрант		0	0	4 dys	Fri 30.6.17	Mon 3.7.17	4 954,80 лв.
82	**BILL B3 / СМЕТКА B3 ROAD EQUIPMENT /**	**ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**		0		96 dys	Sun 2.4.17	Thu 6.7.17	102 129,91 лв.
83	Building of cable routes for traffic lights	Изграждане на кабелни трасета за светофарни уредби	lump	1	0,1	10 dys	Sat 8.4.17	Mon 17.4.17	24 455,38 лв.
84	Traffic and pedestrians lights and controllers	Светофари за пешеходно и автомобилно движение и (	pcs	38	5,43	7 dys	Fri 30.6.17	Thu 6.7.17	27 337,22 лв.
85	Delivery and mounting of pipe-lattice railing	Тръбно-решетъчен парапет с монтиране	m	77,5	15,5	5 dys	Fri 30.6.17	Tue 4.7.17	21 941,75 лв.
86	Mounting of bus shelters with lighting	Монтаж на навеси, на спирки с осветление	pcs	1	0,14	7 dys	Fri 30.6.17	Thu 6.7.17	10 702,36 лв.
87	Street-tidies and benches	Кошчета за боклук и пейки и стълбчета	pcs	339	169,5	2 dys	Fri 30.6.17	Sat 1.7.17	12 231,61 лв.
88	Street lighting	Изграждане на кабелни трасета	lump	1	0,07	15 dys	Sun 2.4.17	Sun 16.4.17	1 820,53 лв.
89	<New Task>	Монтаж на стълбове	lump	0	0	5 dys	Thu 15.6.17	Mon 19.6.17	1 820,53 лв.
90	<New Task>	Монтаж на кабели и осветителни тела	lump	0	0	5 dys	Tue 20.6.17	Sat 24.6.17	1 820,53 лв.
91	Pedestrian and bicycle road	**ПЕШЕХОДЕН И ВЕЛОСИПЕДЕН ПЪТ**		0		106 dys	Fri 10.2.17	Fri 26.5.17	192 978,30 лв.
92	Removal of plates	Премахване на плочи	m2	2535,31	126,77	20 dys	Fri 10.2.17	Wed 1.3.17	15 409,15 лв.
93	Removal of garden curbs	Премахване на градински бордюри	m	1227,5	245,5	5 dys	Sat 11.2.17	Wed 15.2.17	12 635,45 лв.
94	Excavation works	Изкопни работи	m3	683	170,75	4 dys	Thu 2.3.17	Sun 5.3.17	9 424,45 лв.
95	Pipe channel network and moving of existing equipment including sidewalks	ТКМ и преместване на ел. Оборудване включително в тротоари	m	550	55	10 dys	Mon 6.3.17	Wed 15.3.17	38 922,45 лв.
96	Crushed stone	Трошен камък	m3	390	97,5	4 dys	Thu 16.3.17	Sun 19.3.17	15 458,45 лв.
97	New garden curbs in the central reserve (8/16/50)	Нови градински бордюри в разделителната ивица (8/1	m	1216	29,66	41 dys	Mon 20.3.17	Sat 29.4.17	17 769,29 лв.
98	Unipavage	Унипаваж	m2	1950	97,5	20 dys	Sun 30.4.17	Fri 19.5.17	77 897,45 лв.
99	Park lights	Парково осветление	lump	1	0,14	7 dys	Sat 20.5.17	Fri 26.5.17	5 461,61 лв.
100	Cleaning of the site	Почистване на площадката		0	0	10 dys	Fri 7.7.17	Sun 16.7.17	0,00 лв.
101	Prepare for temporary traffic operation	Подготовка за трафик		0	0	0 dys	Sun 16.7.17	Sun 16.7.17	0,00 лв.
102	**Overhaul of Ruski Blvd in the section from the Central Station intersection to Shesti Septemvri Project / Blvd / /Section 3 (from Central Station intersection to W. Gladstone Str. - East lane)/**	**Оновен ремонт на бул"Руски" в участъка от кръстовище Централна гара до бул"Шести септември" /Участък 3 (от кръстовище Централна гара до улица У. Гладстоун - източно платно)/**	Етап 3	0	0	188 dys	Mon 3.7.17	Sat 6.1.18	1 246 111,12 лв.
103	**Main Road**			0		188 dys	Mon 3.7.17	Sat 6.1.18	1 246 111,12 лв.
104	**BILL B1 / СМЕТКА B1 EARTH WORKS /**	**ЗЕМНИ РАБОТИ**		0		96 dys	Mon 3.7.17	Fri 6.10.17	544 427,86 лв.
105	Notice of initiation and project for traffic	Известие за започване и проект за ВОД		0	0	0 dys	Mon 3.7.17	Mon 3.7.17	0,00 лв.
106	Acess to the site	Допуск до работната площадка		0		0 dys	Sun 16.7.17	Sun 16.7.17	0,00 лв.
107	TTO	Пътни знаци и ВОД		0	0	3 dys	Mon 17.7.17	Wed 19.7.17	8 261,65 лв.
108	Demolition asphalt concrete pavement	Разваляне на асфалтобетонова настилка	m2	5766,95	288,35	20 dys	Thu 20.7.17	Tue 8.8.17	21 444,32 лв.
109	Demounting of road signs and posts	Демонтаж на пътни знаци и стълбове	pcs	60	30	2 dys	Thu 20.7.17	Fri 21.7.17	17 746,72 лв.
110	Removal of street curbs	Премахване на улични бордюри	m	1361,5	68,08	20 dys	Sat 22.7.17	Thu 10.8.17	13 600,25 лв.
111	Removal of sidewalk pavement	Премахване на тротоарна настилка	m2	2255,07	112,75	20 dys	Mon 24.7.17	Sat 12.8.17	14 125,70 лв.
112	Pipe channel network and moving of existing equipment including sidewalks	ТКМ и преместване на ел. Оборудване включително в тротоари	m	650		55 dys	Sun 13.8.17	Fri 6.10.17	390 962,67 лв.
113	Removal of manholes and new installation	Премахване на ревизионни шахти и нов монтаж	pcs	45	1,8	25 dys	Sat 22.7.17	Tue 15.8.17	19 893,27 лв.
114	Excavation works	Изкопни работи	m3	5083,25	203,33	25 dys	Wed 16.8.17	Sat 9.9.17	45 683,43 лв.
115	Completion of sawage	Приключване на канализацията		0	0	0 dys	Sat 9.9.17	Sat 9.9.17	0,00 лв.
116	Profiling and strengthening of the earth bed	Профилиране и усилване на земното легло	m2	5820	831,43	7 dys	Sun 10.9.17	Sat 16.9.17	7 755,05 лв.
117	Replacing of stopcocks and fire hydrants	Подмяна на спирателни кранове	pcs	9	3	3 dys	Sun 10.9.17	Tue 12.9.17	4 954,80 лв.
118	**BILL B2 / СМЕТКА B2 ROAD WORKS /**	**ПЪТНИ РАБОТИ**		0	0	75 dys	Sat 30.9.17	Wed 13.12.17	571 925,96 лв.
119	Crushed stone for roadway	Трошен камък за пътно платно	m3	4680,6	234,03	20 dys	Sat 30.9.17	Thu 19.10.17	143 747,39 лв.
120	Delivery and placing of concrete curbs 18/35	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35	m	1329,25	88,62	15 dys	Fri 20.10.17	Fri 3.11.17	44 052,85 лв.
121	Drainage chutes at crosswalks	Отводнителни улеи при пешеходни пътеки	m	37,5	4,69	8 dys	Sat 4.11.17	Sat 11.11.17	16 073,08 лв.
122	Asphalt mixture laying	Битуминизиран трошен камък	m3	823	137,17	6 dys	Wed 15.11.17	Mon 20.11.17	208 516,90 лв.
123	Asphalt laying on the road - Binder	Доставка и полагане на асфалтова смес - Неплътен ас	t	818,25	204,56	4 dys	Tue 21.11.17	Fri 24.11.17	91 980,25 лв.
124	Uni pavement and tactile tiles	Уни паваж и тактилни плочи	m2	1611,16	107,41	15 dys	Sat 25.11.17	Sat 9.12.17	62 600,69 лв.
125	Fire hydrant	Противопожарен хидрант		0	0	4 dys	Sun 10.12.17	Wed 13.12.17	4 954,80 лв.
126	**BILL B3 / СМЕТКА B3 ROAD EQUIPMENT /**	**ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**		0		112 dys	Sun 10.9.17	Sat 30.12.17	129 757,30 лв.
127	Building of cable routes for traffic lights	Изграждане на кабелни трасета за светофарни уредби	lump	1	0,1	10 dys	Sun 17.9.17	Tue 26.9.17	22 577,37 лв.
128	Traffic and pedestrians lights and controllers	Светофари за пешеходно и автомобилно движение и (	pcs	38	2,53	15 dys	Sun 10.12.17	Sun 24.12.17	58 417,05 лв.
129	Delivery and mounting of pipe-lattice railing	Тръбно-решетъчен парапет с монтиране	m	77,5	15,5	5 dys	Sun 10.12.17	Thu 14.12.17	8 333,53 лв.
130	Mounting of bus shelters with lighting	Монтаж на навеси, на спирки с осветление	pcs	1	0,17	6 dys	Fri 15.12.17	Wed 20.12.17	10 074,64 лв.
131	Street-tidies and benches	Кошчета за боклук и пейки и стълбчета	pcs	339	33,9	10 dys	Thu 21.12.17	Sat 30.12.17	24 893,12 лв.
132	Street lights	Изграждане на кабелни трасета	lump	1	0,05	20 dys	Sun 10.9.17	Fri 29.9.17	1 820,53 лв.
133	Installation of poles	Монтаж на стълбове	lump	0	0	5 dys	Sat 25.11.17	Wed 29.11.17	1 820,53 лв.
134	Installation of cables and fixtures	Монтаж на кабели и осветителни тела	lump	0	0	5 dys	Thu 30.11.17	Mon 4.12.17	1 820,53 лв.
135	Cleaning of the site	Почистване на площадката		0	0	7 dys	Sun 31.12.17	Sat 6.1.18	0,00 лв.
136	Prepare for temporary traffic operation	Подготовка за трафик		0	0	0 dys	Sat 6.1.18	Sat 6.1.18	0,00 лв.
137	**Overhaul of Ruski Blvd in the section from the Central Station intersection to Shesti Septemvri Project / Blvd / /Section 4 (from W. Gladstone Str. to finish object - West lane)/**	**Оновен ремонт на бул"Руски" в участъка от кръстовище Централна гара до бул"Шести септември" /Участък 4 (от ул. У. Гладстоун до край обект - западно платно)/**	Етап 4	0		206 dys	Sun 24.12.17	Tue 17.7.18	1 700 542,96 лв.
138	**Main Road**			0		206 dys	Sun 24.12.17	Tue 17.7.18	1 700 542,96 лв.
139	**BILL B1 / СМЕТКА B1 EARTH WORKS /**	**ЗЕМНИ РАБОТИ**		0		103 dys	Sun 24.12.17	Thu 5.4.18	546 622,62 лв.
140	Notice of initiation and project for traffic	Известие за започване и проект за ВОД		0	0	0 dys	Sun 24.12.17	Sun 24.12.17	0,00 лв.
141	Acess to the site	Допуск до работната площадка		0		0 dys	Sat 6.1.18	Sat 6.1.18	0,00 лв.
142	TTO	Пътни знаци и ВОД		0	0	3 dys	Sun 7.1.18	Tue 9.1.18	8 261,65 лв.
143	Demolition asphalt concrete pavement	Разваляне на асфалтобетонова настилка	m2	6046,95	403,13	15 dys	Wed 10.1.18	Wed 24.1.18	22 356,20 лв.
144	Demounting of road signs and posts	Демонтаж на пътни знаци и стълбове	pcs	60	6,67	9 dys	Wed 10.1.18	Thu 18.1.18	17 746,72 лв.
145	Removal of street curbs	Премахване на улични бордюри	m	1411,5	70,58	20 dys	Fri 19.1.18	Wed 7.2.18	13 960,25 лв.
146	Removal of sidewalk pavement	Премахване на тротоарна настилка	m2	2255,07	112,75	20 dys	Sun 21.1.18	Fri 9.2.18	14 125,70 лв.
147	Pipe channel network and moving of existing equipment including sidewalks	ТКМ и преместване на ел. Оборудване включително в тротоари	m	550		55 dys	Sat 10.2.18	Thu 5.4.18	390 962,67 лв.
148	Removal of manholes and new installation	Премахване на ревизионни шахти и нов монтаж	pcs	45	1,8	25 dys	Fri 19.1.18	Mon 12.2.18	19 893,27 лв.
149	Excavation works	Изкопни работи	m3	5195,25	207,81	25 dys	Tue 13.2.18	Fri 9.3.18	46 606,31 лв.
150	Completion of sewage	Приключване на канализацията		0	0	0 dys	Fri 9.3.18	Fri 9.3.18	0,00 лв.
151	Profiling and strengthening of the earth bed	Профилиране и усилване на земното легло	m2	5820	831,43	7 dys	Sat 10.3.18	Fri 16.3.18	7 755,05 лв.
152	Replacing of stopcocks and fire hydrants	Подмяна на спирателни кранове	pcs	9	3	3 dys	Sat 10.3.18	Mon 12.3.18	4 954,80 лв.
153	**BILL B2 / СМЕТКА B2 ROAD WORKS /**	**ПЪТНИ РАБОТИ**		0	0	81 dys	Fri 30.3.18	Mon 18.6.18	928 031,01 лв.
154	Трошен камък за пътно платно	Трошен камък за пътно платно	m3	4792,6	239,63	20 dys	Fri 30.3.18	Wed 18.4.18	147 096,19 лв.
155	Placing of concrete kerbs (18/35/50)	Нови бетонни бордюри (18/35/50)	m	1379,25	91,95	15 dys	Thu 19.4.18	Thu 3.5.18	45 438,35 лв.
156	Drainage chutes at crosswalks	Отводнителни улеи при пешеходни пътеки	m	37,5	4,69	8 dys	Fri 4.5.18	Fri 11.5.18	16 073,08 лв.
157	Asphalt base coarse d=15	Битуминизиран трошен камък Eo=700 Mpa	m3	923	153,83	6 dys	Sat 12.5.18	Thu 17.5.18	232 975,90 лв.
158	Asphalt laying on the road - Binder	Доставка и полагане на асфалтова смес - Неплътен ас	t	858,25	214,56	4 dys	Fri 18.5.18	Mon 21.5.18	96 291,05 лв.
159	Uni pavement and tactile	Уни паваж и тактилни плочи	m2	1611,16	230,17	7 dys	Tue 22.5.18	Mon 28.5.18	62 600,69 лв.
160	Fire hydrant	Противопожарен хидрант		0	0	4 dys	Tue 29.5.18	Fri 1.6.18	4 954,80 лв.
161	Trial stretch of dense asphaltic concrete	Пробен участък за плътен асфалтобетон		0	0	2 dys	Sat 2.6.18	Sun 3.6.18	0,00 лв.
162	Mound of sandy clay and humus for dividing strip and green areas	План за временна организация на движение на всички етапи		0	0	0 dys	Mon 28.5.18	Mon 28.5.18	0,00 лв.
163	Asphalt laying on the road - Dense asphalt concrete	Доставка и полагане на асфалтова смес - Плътен асфалтобетон	t	2235	279,38	8 dys	Mon 11.6.18	Mon 18.6.18	315 067,95 лв.
164	Strengthening meshes between dense asphalt concrete and binder	Усилващи мрежи между плътния и неплътния асфалтобетон	m2	1620	405	4 dys	Mon 11.6.18	Thu 14.6.18	7 533,00 лв.
165	**BILL B3 / СМЕТКА B3 ROAD EQUIPMENT /**	**ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**		0		111 dys	Sat 10.3.18	Thu 28.6.18	225 889,33 лв.
166	Building of cable routes for traffic lights	Изграждане на кабелни трасета за светофарни уредби	lump	1	0,1	10 dys	Sat 17.3.18	Mon 26.3.18	22 577,37 лв.
167	Traffic and pedestrians lights and controllers	Светофари за пешеходно и автомобилно движение и (	pcs	38	2,53	15 dys	Tue 29.5.18	Tue 12.6.18	58 417,05 лв.
168	Traffic signs and marking of the road and cabri	Пътни знаци и маркировка и кабри	lump	1	0,14	7 dys	Tue 19.6.18	Mon 25.6.18	96 132,03 лв.
169	Delivery and mounting of pipe-lattice railing	Тръбно-решетъчен парапет с доставка и монтиране	m	77,5	12,92	6 dys	Tue 29.5.18	Sun 3.6.18	8 333,53 лв.
170	Mounting of bus shelters with lighting and information board	Монтаж на навеси, на спирки с осветление и указателна табела	pcs	1	0,09	11 dys	Mon 4.6.18	Thu 14.6.18	10 074,64 лв.
171	Street-tidies and benches	Кошчета за боклук и пейки и стълбчета	pcs	339	42,38	8 dys	Fri 15.6.18	Fri 22.6.18	24 893,12 лв.
172	Street lights	Изграждане на кабелни трасета	lump	1	0,05	20 dys	Sat 10.3.18	Thu 29.3.18	1 820,53 лв.
173	Installation of poles	Монтаж на стълбове	lump	0	0	5 dys	Tue 19.6.18	Sat 23.6.18	1 820,53 лв.
174	Installation of cables and fixtures	Монтаж на кабели и осветителни тела	lump	0	0	5 dys	Sun 24.6.18	Thu 28.6.18	1 820,53 лв.
175	Cleaning of the site	Почистване на площадката		0	0	5 dys	Fri 29.6.18	Tue 3.7.18	0,00 лв.
176	**TAKING OVER**	**ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДАВАНЕ НА УЧАСТЪКА**		0		44 dys	Mon 4.6.18	Tue 17.7.18	0,00 лв.
177	Built in drawings	Изготвяне екзекутивни чертежи		0	0	40 dys	Mon 4.6.18	Fri 13.7.18	0,00 лв.
178	Notice of completion of works	Известие за завършване на работата		0	0	0 dys	Wed 13.6.18	Wed 13.6.18	0,00 лв.
179	Testing for taking over	Проверки преди приемането		0	0	14 dys	Wed 4.7.18	Tue 17.7.18	0,00 лв.
180	Taking over certificate	Заключителен сертификат		0	0	0 dys	Tue 17.7.18	Tue 17.7.18	0,00 лв.
181	**Construction works of Komatevsko shose Blvd**	**Строителни работи на на бул "Коматевско шосе"**		0		711 dys	Sun 31.7.16	Wed 11.7.18	6 083 017,14 лв.
182	**Overhaul and widening of Komatevsko shose Blvd within Plovdiv Municipality from Al Stamboliiski Str to the entrance of Komatevo Housing Estate - phase I /Section 1 (from Al Stamboliiski Str to the entrance of Filkab)/**	**Основен ремонт и разширение на бул "Коматевско шосе" в обхвата на Общ Пловдив от ул "Ал Стамболийски" до входа на кв Коматево - Етап I /Участък 1 (от к-ще бул. Ал. Стамболийски до входа на Филкаб)/**	Етап 1	0		231 dys	Sun 31.7.16	Sat 18.3.17	1 269 927,56 лв.
183	**PART ROAD**	**ЧАСТ ПЪТНА**		0		231 dys	Sun 31.7.16	Sat 18.3.17	1 269 927,56 лв.
184	Notice of initiation and project TTO	Известие за започване и проект за ВОД		0	0	0 dys	Sun 31.7.16	Sun 31.7.16	0,00 лв.
185	Acess to the site	Допуск до работната площадка		0		0 dys	Sat 13.8.16	Sat 13.8.16	0,00 лв.
186	TTO	Пътни знаци и ВОД	pcs	66	33	4 dys	Sun 14.8.16	Wed 17.8.16	8 746,52 лв.
187	Cleaning of the areas	Разчистване площите	m2	26,16	26,16	1 dy	Thu 18.8.16	Thu 18.8.16	4 821,23 лв.
188	Demolition asphalt concrete pavement	Разваляне на асфалтобетонова настилка	m3	168	84	2 dys	Fri 19.8.16	Sat 20.8.16	8 408,76 лв.
189	Demolition of paving-block pavement	Разваляне на паважна настилка	m2	719,41	239,8	3 dys	Sun 21.8.16	Tue 23.8.16	11 106,25 лв.
190	Demolition of sidewalks	Разваляне на тротоари	m2	1074,3	268,57	4 dys	Wed 24.8.16	Sat 27.8.16	9 798,83 лв.
191	Breaking up of concrete curbs and strips	Разрушаване на бетонови бордюри и ивици	m	1103,3	183,88	3 dys	Sun 28.8.16	Tue 30.8.16	12 535,55 лв.
192	Demolition of existing crushed stone pavement and excavation	Разрушаване на съществуващ трошен камък настилка и изкопни работи	m3	5555,78	222,23	25 dys	Wed 31.8.16	Sat 24.9.16	53 993,26 лв.
193	Pipe channel network and moving of existing equipment including sidewalks	ТКМ и преместване на ел. Оборудване включително в тротоари	m	560	6,51	86 dys	Thu 1.9.16	Fri 25.11.16	531 875,73 лв.
194	Profiling earthly bed	Профилиране на земното легло	m2	5402	180,07	30 dys	Fri 30.9.16	Sat 29.10.16	0,00 лв.
195	Supply and installation of separating geotextile and geogrid amplification and connectivity with parallel track	Доставка и полагане на сепариращ геотекстил и геомрежа за усилване и за връзка с успоредно трасе	m2	4640,13	154,67	30 dys	Wed 5.10.16	Thu 3.11.16	24 870,88 лв.
196	Crushed stone for roadway	Трошен камък за пътно платно	m3	3315,67	72,08	46 dys	Wed 5.10.16	Sat 19.11.16	107 365,58 лв.
197	Delivery and placing of concrete curbs 18/35	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35	m	1319,34	34,72	38 dys	Mon 10.10.16	Wed 16.11.16	41 150,60 лв.
198	Crushed stone 0/40 for sidewalks	Трошен камък 0/40 за тротоари	m3	524,94	15	35 dys	Thu 17.11.16	Wed 21.12.16	24 681,41 лв.
199	Delivery and placing of concrete curbs 8/16	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16	m	745,56	18,64	40 dys	Sat 12.11.16	Wed 21.12.16	13 158,29 лв.
200	Asphalt laying on the road - asphalt mixture for the base layer of type Ao	Доставка и полагане на асфалтова смес - асфалтова смес за основен пласт Тип Ао	t	1590	530	3 dys	Sat 26.11.16	Mon 28.11.16	160 841,56 лв.
201	Experienced stretch of polymer modified bitum	Опитен участък за полимермодифициран битум		0	0	2 dys	Tue 29.11.16	Wed 30.11.16	0,00 лв.
202	Asphalt laying on the road - asphalt mixture for the lower layer of the covering 0/16 /binder/, with polymer modified bitumen	Доставка и полагане на асфалтова смес - асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/16 /биндер/, с полимермодифициран битум	t	778,26	194,57	4 dys	Mon 5.12.16	Thu 8.12.16	101 667,18 лв.
203	Biaxial geogrid of fiberglass	Доставка и полагане на усилваща биаксиална геомрежа от фибростъкло	m2	2315,16	1157,58	2 dys	Wed 7.12.16	Thu 8.12.16	15 357,30 лв.
204	Humus and Greenery	Хумус и озеленяване	m3	197,25	49,31	4 dys	Wed 15.2.17	Sat 18.2.17	7 195,50 лв.
205	Poles for street lighting and traffic lights	Стълбове за улично осветление и за светофари	lump	0	0	5 dys	Sun 19.2.17	Thu 23.2.17	24 407,00 лв.
206	Asphalt laying on the sidewalks	Плътен асфалтобетон за тротоар	m2	3881,38	1940,69	2 dys	Sun 5.3.17	Mon 6.3.17	49 227,67 лв.
207	Delivery and placing of tactile tiles	Доставка и полагане на тактилни плочи	m2	109	15,57	7 dys	Tue 28.2.17	Mon 6.3.17	9 904,46 лв.
208	Street lighting and traffic lights	Кабелни трасета за улично осветление и светофари	lump	0	0	10 dys	Thu 15.12.16	Sat 24.12.16	24 407,00 лв.
209	Installation of cables and lamps for street lighting and installation of cables for lights	Монтаж на кабели и осветителни тела за улично осветление и монтаж на кабели за светофари	lump	0	0	5 dys	Tue 7.3.17	Sat 11.3.17	24 407,00 лв.
210	Cleaning of the site	Почистване на площадката		0	0	7 dys	Sun 12.3.17	Sat 18.3.17	0,00 лв.
211	**Overhaul and widening of Komatevsko shose Blvd within Plovdiv Municipality from Al Stamboliiski Str to the entrance of Komatevo Housing Estate - phase I /Section 2 (from the entrance of Filkab to the entrance of Meskom)/**	**Основен ремонт и разширение на бул "Коматевско шосе" в обхвата на Общ Пловдив от ул "Ал Стамболийски" до входа на кв Коматево - Етап I /Участък 2 (от входа на Филкаб до входа на Меском)/**	Етап 2	0		222 dys	Wed 26.10.16	Sun 4.6.17	1 750 336,26 лв.
212	**PART ROAD**	**ЧАСТ ПЪТНА**		0		222 dys	Wed 26.10.16	Sun 4.6.17	1 750 336,26 лв.
213	Notice of initiation and project TTO	Известие за започване и проект за ВОД		0	0	0 dys	Wed 26.10.16	Wed 26.10.16	0,00 лв.
214	Acess to the site	Допуск до работната площадка		0		0 dys	Wed 9.11.16	Wed 9.11.16	0,00 лв.
215	TTO	Пътни знаци и ВОД	pcs	66	66	1 dy	Wed 9.11.16	Wed 9.11.16	10 823,88 лв.
216	Cleaning of the areas	Разчистване площите	m2	36,36	36,36	1 dy	Thu 10.11.16	Thu 10.11.16	4 910,61 лв.
217	Demolition of paving-block pavement	Разваляне на паважна настилка	m2	1434,42	179,3	8 dys	Thu 10.11.16	Thu 17.11.16	21 078,15 лв.
218	Instruction for archeology	Инструкция за Археология		0	0	0 dys	Thu 10.11.16	Thu 10.11.16	4 591,80 лв.
219	Opinion of Archaeology	Становище за Археология		0	0	0 dys	Tue 6.12.16	Tue 6.12.16	0,00 лв.
220	Demolition of sidewalks	Разваляне на тротоари	m2	1493,19	213,31	7 dys	Wed 7.12.16	Tue 13.12.16	11 829,08 лв.
221	Breaking up of concrete curbs and strips	Разрушаване на бетонови бордюри и ивици	m	1533,48	219,07	7 dys	Wed 14.12.16	Tue 20.12.16	15 632,88 лв.
222	Demolition of existing crushed stone pavement and excavation	Разрушаване на съществуващ трошен камък настилка и изкопни работи	m3	654,5	327,25	2 dys	Sat 17.12.16	Sun 18.12.16	32 512,13 лв.
223	Demolition of existing crushed stone pavement and excavation	Разрушаване на съществуващ трошен камък настилка и изкопни работи	m3	5900	491,67	12 dys	Sat 17.12.16	Wed 28.12.16	32 512,13 лв.
224	Manual excavation	Ръчен изкоп		0	0	65 dys	Mon 19.12.16	Tue 21.2.17	0,00 лв.
225	Sewage system - third party	Канализация - трета страна		0	0	22 dys	Thu 1.12.16	Thu 22.12.16	0,00 лв.
226	Competition of works with sawage system	Приключване на канализацията		0	0	0 dys	Thu 22.12.16	Thu 22.12.16	0,00 лв.
227	Completion of Citygas	Приключване на Ситигаз		0	0	0 dys	Thu 29.12.16	Thu 29.12.16	0,00 лв.
228	Completion of Cable Operators	Приключване на Кабелни оператори		0	0	0 dys	Thu 5.1.17	Thu 5.1.17	0,00 лв.
229	Pipe channel network and moving of existing equipment including sidewalks	ТКМ и преместване на ел. Оборудване включително в тротоари	m	650	10,83	60 dys	Sat 17.12.16	Tue 14.2.17	737 468,11 лв.
230	Archeology permision for preservation	Становище за Археология		0	0	0 dys	Tue 21.2.17	Tue 21.2.17	0,00 лв.
231	Profiling earthly bed	Профилиране на земното легло	m2	7506	1072,29	7 dys	Wed 22.2.17	Tue 28.2.17	0,00 лв.
232	Supply and installation of separating geotextile and geogrid amplification and connectivity with parallel track	Доставка и полагане на сепариращ геотекстил и геомрежа за усилване и за връзка с успоредно трасе	m2	6449,35	921,34	7 dys	Wed 22.2.17	Tue 28.2.17	30 987,50 лв.
233	Crushed stone for roadway	Трошен камък за пътно платно	m3	4608,47	184,34	25 dys	Wed 22.2.17	Sat 18.3.17	147 437,92 лв.
234	Delivery and placing of concrete curbs 18/35	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35	m	1833,75	52,39	35 dys	Fri 24.3.17	Thu 27.4.17	55 405,18 лв.
235	Crushed stone 0/40 for sidewalks	Трошен камък 0/40 за тротоари	m3	729,63	145,93	5 dys	Fri 28.4.17	Tue 2.5.17	32 514,51 лв.
236	Delivery and placing of concrete curbs 8/16,	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16	m	1036,26	103,63	10 dys	Wed 3.5.17	Fri 12.5.17	16 498,43 лв.
237	Asphalt laying on the road - asphalt mixture for the base layer of type Ao	Доставка и полагане на асфалтова смес - асфалтова смес за основен пласт Тип Ао	t	2072,52	296,07	7 dys	Fri 28.4.17	Thu 4.5.17	221 764,64 лв.
238	Biaxial geogrid of fiberglass	Доставка и полагане на усилваща биаксиална геомрех	m2	3217,86	804,47	4 dys	Sat 6.5.17	Tue 9.5.17	19 554,86 лв.
239	Asphalt laying on the road - asphalt mixture for the lower layer of the covering 0/16 /binder/, with polymer modified bitumen	Доставка и полагане на асфалтова смес - асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/16 /биндер/, с полимермодифициран битум	t	1081,71	216,34	5 dys	Fri 5.5.17	Tue 9.5.17	139 517,66 лв.
240	Delivery and placing of tactile tiles	Доставка и полагане на тактилни плочи	m2	109	15,57	7 dys	Sun 7.5.17	Sat 13.5.17	9 880,09 лв.
241	Poles for street lighting and traffic lights	Стълбове за улично осветление и за светофари	lump	0	0	3 dys	Tue 9.5.17	Thu 11.5.17	46 442,21 лв.
242	Asphalt laying on the sidewalks	Плътен асфалтобетон за тротоар	m2	4721,98	1180,49	4 dys	Wed 10.5.17	Sat 13.5.17	58 894,57 лв.
243	Street LIGHTING including traffic lights and marking	Кабелни трасета за улично осветление и светофари	lump	0	0	23 dys	Thu 19.1.17	Fri 10.2.17	46 442,21 лв.
244	Humus and Greenery	Хумус и озеленяване	m3	197,25	32,88	6 dys	Sat 13.5.17	Thu 18.5.17	7 195,50 лв.
245	Installation of cables and lamps for street lighting and installation of cables for lights	Монтаж на кабели и осветителни тела за улично осветление и монтаж на кабели за светофари	lump	0	0	7 dys	Fri 19.5.17	Thu 25.5.17	46 442,21 лв.
246	Cleaning of the site	Почистване на площадката		0	0	10 dys	Fri 26.5.17	Sun 4.6.17	0,00 лв.
247	Prepare for temporary traffic operation	Подготовка за трафик		0	0	0 dys	Sun 4.6.17	Sun 4.6.17	0,00 лв.
248	**Overhaul and widening of Komatevsko shose Blvd within Plovdiv Municipality from Al Stamboliiski Str to the entrance of Komatevo Housing Estate - phase I /Section 3 (from the entrance of Meskom to the entrance of UMHAT Eurohospital)/**	**Основен ремонт и разширение на бул "Коматевско шосе" в обхвата на Общ Пловдив от ул "Ал Стамболийски" до входа на кв Коматево - Етап I /Участък 3 (от входа на Меском до входа на УМБАЛ Еврохоспитал)/**	етап 3	0		166 dys	Mon 22.5.17	Fri 3.11.17	1 470 441,45 лв.
249	**PART ROAD**	**ЧАСТ ПЪТНА**		0		166 dys	Mon 22.5.17	Fri 3.11.17	1 470 441,45 лв.
250	Design of TTO and notice of work beginning	Известие за започване и проект по ВОД		0		0 dys	Mon 22.5.17	Mon 22.5.17	0,00 лв.
251	Acess to the site	Допуск до работната площадка		0		0 dys	Sun 4.6.17	Sun 4.6.17	0,00 лв.
252	TTO	Пътни знаци и ВОД	pcs	66	66	1 dy	Mon 5.6.17	Mon 5.6.17	8 746,52 лв.
253	Cleaning of the areas	Разчистване площите	m2	31,92	10,64	3 dys	Mon 5.6.17	Wed 7.6.17	4 871,74 лв.
254	Demolition of paving-block pavement	Разваляне на паважна настилка	m2	1259,24	89,95	14 dys	Thu 8.6.17	Wed 21.6.17	19 064,80 лв.
255	Demolition of sidewalks	Разваляне на тротоари	m2	1310,85	145,65	9 dys	Thu 22.6.17	Fri 30.6.17	10 945,33 лв.
256	Breaking up of concrete curbs and strips	Разрушаване на бетонови бордюри и ивици	m	1346,23	134,62	10 dys	Sat 1.7.17	Mon 10.7.17	14 284,62 лв.
257	Demolition of existing crushed stone pavement and excavation	Разрушаване на съществуващ трошен камък настилка и изкопни работи	m3	5754,11	230,16	25 dys	Tue 11.7.17	Fri 4.8.17	57 644,71 лв.
258	Pipe channel network and moving of existing equipment including sidewalks	ТКМ и преместване на ел. Оборудване включително в тротоари	m	710	16,51	43 dys	Tue 11.7.17	Tue 22.8.17	647 974,94 лв.
259	Completion of Citygas	Приключване на Ситигаз		0	0	0 dys	Fri 4.8.17	Fri 4.8.17	0,00 лв.
260	Completion of cable operators	Приключване на кабелни оператори		0	0	0 dys	Wed 9.8.17	Wed 9.8.17	0,00 лв.
261	Profiling earthly bed	Профилиране на земното легло	m2	6590	549,17	12 dys	Thu 10.8.17	Mon 21.8.17	0,00 лв.
262	Supply and installation of separating geotextile and geogrid amplification and connectivity with parallel track	Доставка и полагане на сепариращ геотекстил и геомрежа за усилване и за връзка с успоредно трасе	m2	5661,79	471,82	12 dys	Thu 10.8.17	Mon 21.8.17	28 324,96 лв.
263	Crushed stone for roadway	Трошен камък за пътно платно	m3	4045,73	183,9	22 dys	Thu 10.8.17	Thu 31.8.17	129 994,67 лв.
264	Delivery and placing of concrete curbs 18/35	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35	m	1609,83	123,83	13 dys	Sun 3.9.17	Fri 15.9.17	49 200,24 лв.
265	Crushed stone 0/40 for sidewalks	Трошен камък 0/40 за тротоари	m3	640,53	160,13	4 dys	Sat 16.9.17	Tue 19.9.17	29 104,80 лв.
266	Delivery and placing of concrete kerbs 8/16	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16	m	909,72	60,65	15 dys	Wed 20.9.17	Wed 4.10.17	15 044,48 лв.
267	Asphalt laying on the road - asphalt mixture for the base layer of type Ao	Доставка и полагане на асфалтова смес - асфалтова смес за основен пласт Тип Ао	t	1819,44	259,92	7 dys	Sat 16.9.17	Fri 22.9.17	195 245,19 лв.
268	Biaxial geogrid of fiberglass	Доставка и полагане на усилваща биаксиална геомрех	m2	2824,92	564,98	5 dys	Sat 23.9.17	Wed 27.9.17	17 727,68 лв.
269	Asphalt laying on the road - asphalt mixture for the lower layer of the covering 0/16 /binder/, with polymer modified bitumen	Доставка и полагане на асфалтова смес - асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/16 /биндер/, с полимермодифициран битум	t	949,62	189,92	5 dys	Sat 23.9.17	Wed 27.9.17	123 041,57 лв.
270	Delivery and placing of tactile tiles	Доставка и полагане на тактилни плочи	m2	109	12,11	9 dys	Thu 28.9.17	Fri 6.10.17	9 880,09 лв.
271	Poles for street lighting and traffic lights	Стълбове за улично осветление и за светофари	lump	0	0	7 dys	Thu 28.9.17	Wed 4.10.17	15 821,00 лв.
272	Asphalt laying on the sidewalks	Плътен асфалтобетон за тротоар	m2	4356,07	622,3	7 dys	Thu 5.10.17	Wed 11.10.17	54 686,61 лв.
273	Street lighting and traffic lights	Кабелни трасета за улично осветление и светофари	lump	0	0	23 dys	Sat 1.7.17	Sun 23.7.17	15 821,00 лв.
274	Humus and Greenery	Хумус и озеленяване	m3	197,25	32,88	6 dys	Thu 12.10.17	Tue 17.10.17	7 195,50 лв.
275	Installation of cables and lamps for street lighting and installation of cables for lights	Монтаж на кабели и осветителни тела за улично осветление и монтаж на кабели за светофари	lump	0	0	7 dys	Wed 18.10.17	Tue 24.10.17	15 821,00 лв.
276	Cleaning of the site	Почистване на площадката		0	0	10 dys	Wed 25.10.17	Fri 3.11.17	0,00 лв.
277	Prepare for temporary traffic operation	Подготовка за трафик		0	0	0 dys	Fri 3.11.17	Fri 3.11.17	0,00 лв.
278	**Overhaul and widening of Komatevsko shose Blvd within Plovdiv Municipality from Al Stamboliiski Str to the entrance of Komatevo Housing Estate - phase I /Section 4 (from the entrance UMHAT Eurohospital to the entrance of Komatevo Housing)/**	**Основен ремонт и разширение на бул "Коматевско шосе" в обхвата на Общ Пловдив от ул "Ал Стамболийски" до входа на кв Коматево - Етап I /Участък 4 (от входа на УМБАЛ Еврохоспитал до входа на кв. Коматево)/**	етап 4	0		264 dys	Sat 21.10.17	Wed 11.7.18	1 592 311,87 лв.
279	**PART ROAD**	**ЧАСТ ПЪТНА**		0		250 dys	Sat 21.10.17	Wed 27.6.18	1 592 311,87 лв.
280	Design of TTO and notice of work beginning	Известие за започване и проект по ВОД		0		0 dys	Sat 21.10.17	Sat 21.10.17	0,00 лв.
281	Acess to the site	Допуск до работната площадка		0		0 dys	Fri 3.11.17	Fri 3.11.17	0,00 лв.
282	TTO	Пътни знаци и ВОД	pcs	66	33	2 dys	Sat 4.11.17	Sun 5.11.17	6 669,16 лв.
283	Cleaning of the areas	Разчистване площите	m2	25,56	12,78	2 dys	Sat 4.11.17	Sun 5.11.17	4 815,96 лв.
284	Demolition of existing asphalt concrete pavement	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настил	m3	698	49,86	14 dys	Mon 6.11.17	Sun 19.11.17	20 450,36 лв.
285	Demolition of paving-block pavement	Разваляне на паважна настилка	m2	2758	306,44	9 dys	Mon 6.11.17	Tue 14.11.17	8 646,06 лв.
286	Demolition of sidewalks	Разваляне на тротоари	m2	1049,66	104,97	10 dys	Wed 15.11.17	Fri 24.11.17	9 679,40 лв.
287	Breaking up of concrete curbs and strips	Разрушаване на бетонови бордюри и ивици	m	1077,99	154	7 dys	Sat 25.11.17	Fri 1.12.17	12 353,35 лв.
288	Demolition of existing crushed stone pavement and excavation	Разрушаване на съществуващ трошен камък настилка и изкопни работи	m3	8096,62	323,86	25 dys	Sat 2.12.17	Tue 26.12.17	29 189,25 лв.
289	Pipe channel network and moving of existing equipment including sidewalks	ТКМ и преместване на ел. Оборудване включително в тротоари	m	510	11,86	43 dys	Sat 2.12.17	Sat 13.1.18	465 356,91 лв.
290	Completion of Citygas	Приключване на Ситигаз		0	0	0 dys	Sun 18.2.18	Sun 18.2.18	0,00 лв.
291	Completion of cable operators	Приключване на кабелни оператори		0	0	0 dys	Thu 22.2.18	Thu 22.2.18	0,00 лв.
292	Profiling earthly bed	Профилиране на земното легло	m2	5277	439,75	12 dys	Fri 23.2.18	Tue 6.3.18	0,00 лв.
293	Supply and installation of separating geotextile and geogrid amplification and connectivity with parallel track	Доставка и полагане на сепариращ геотекстил и геомрежа за усилване и за връзка с успоредно трасе	m2	4533,7	377,81	12 dys	Fri 23.2.18	Tue 6.3.18	24 511,09 лв.

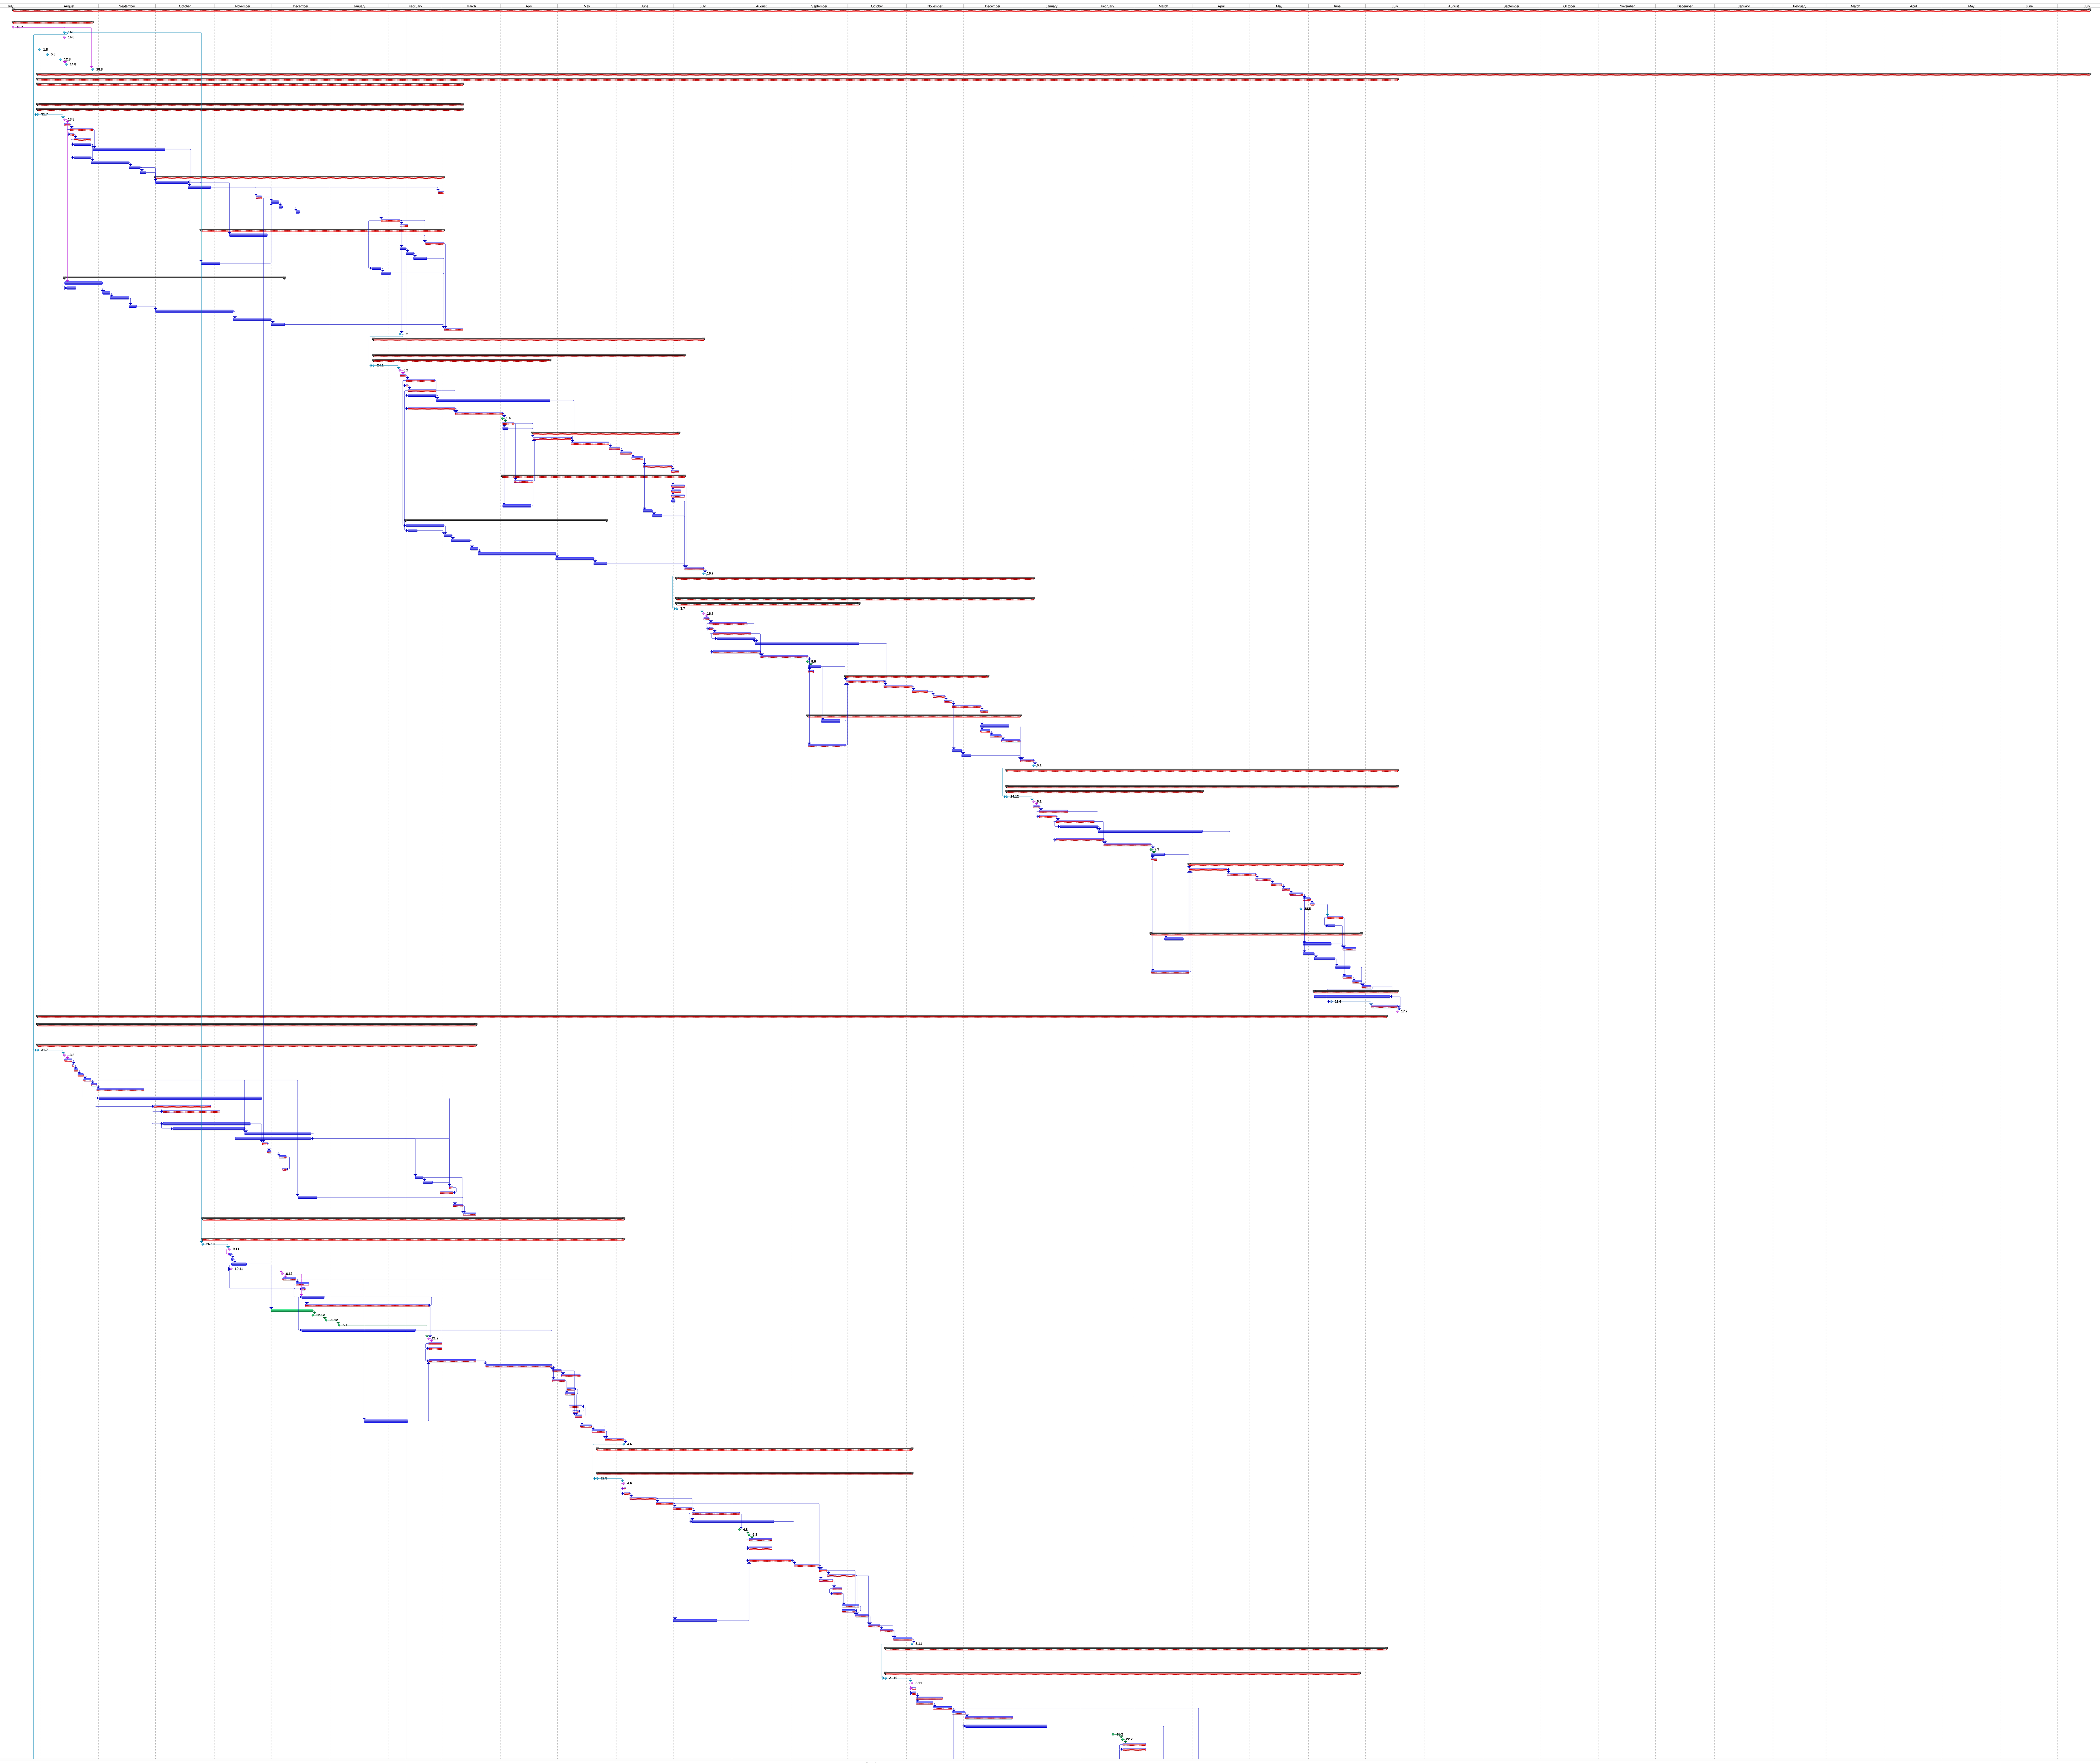

WORKS RELATED TO THE REHABILITATION OF RUSKI, KOMATEVSKO AND SHESTI SEPTEMVRI BOULEVARDS AND TO THE COMPLETION OF SEVEREN BOULEVARD
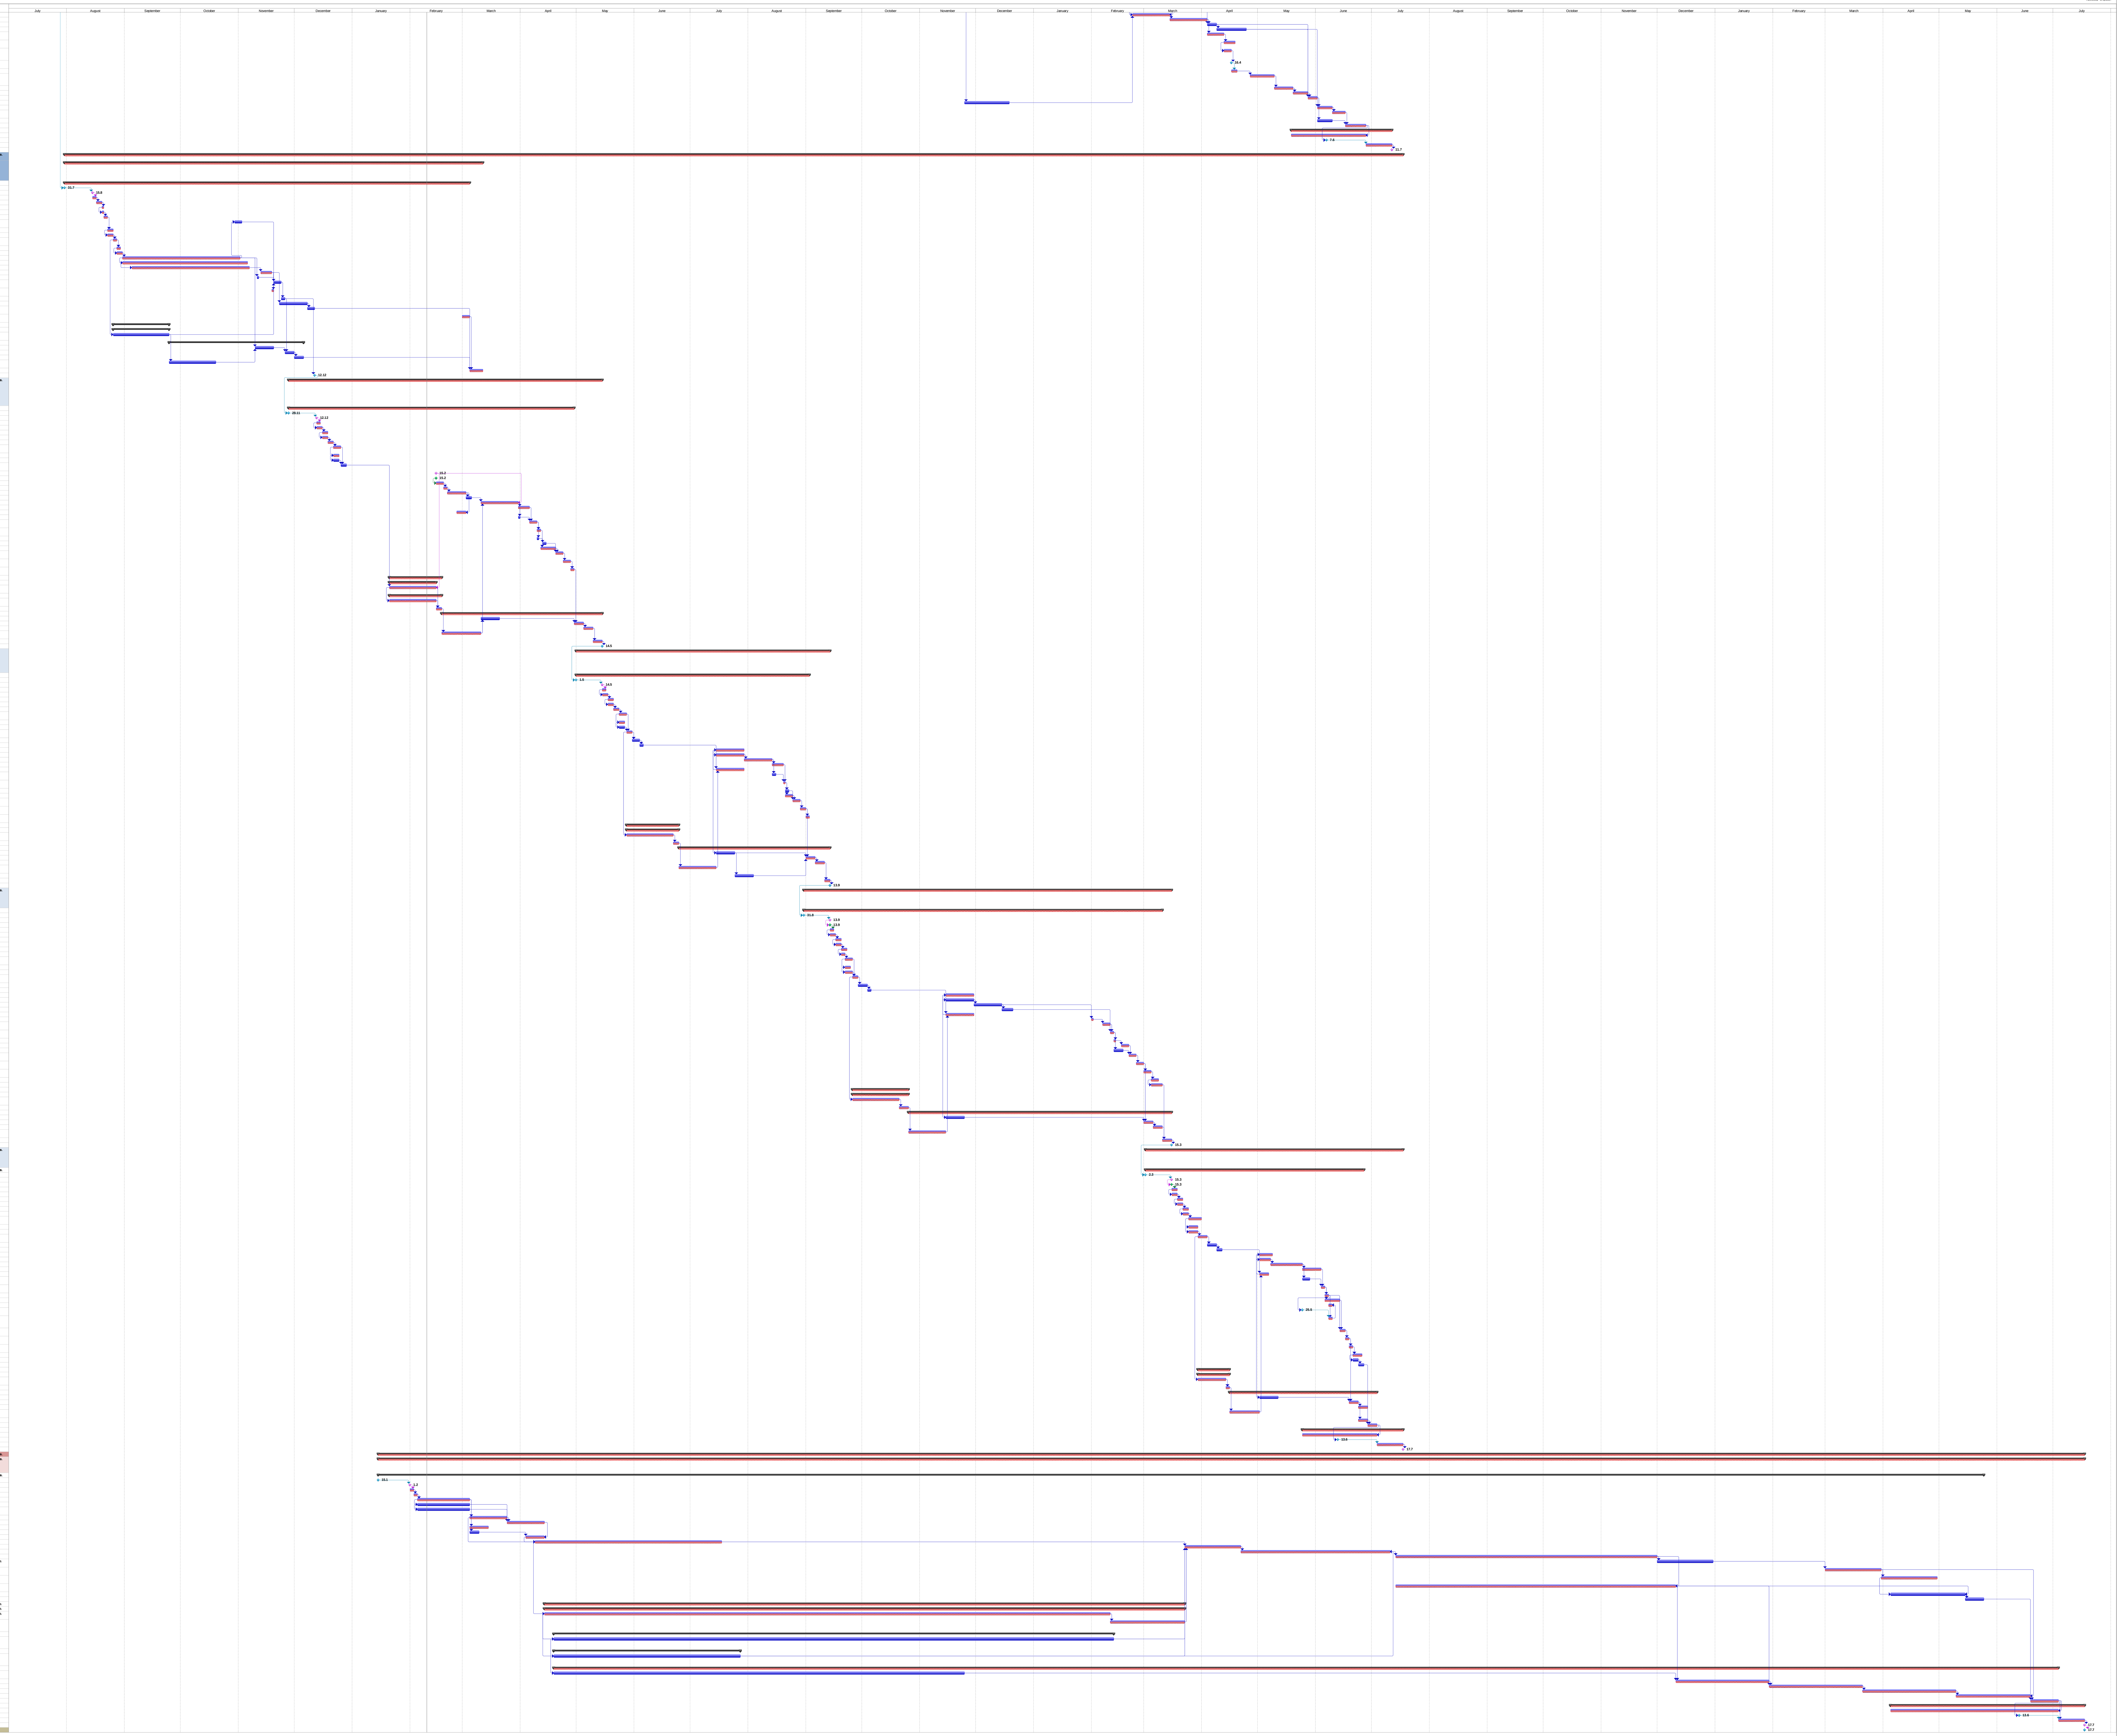
ID	Construction and non-construction activities	Строителни и нестроителни дейности	Ед.м.	Общо колич.	Произв.	Календ. дни	Начална дата	Finish	Cost
294	Crushed stone for roadway	Трошен камък за пътно платно	m3	3239,62	161,98	20 dys	Fri 23.2.18	Wed 14.3.18	105 008,38 лв.
295	Delivery and placing of concrete curbs 18/35	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35	m	1289,08	64,45	20 dys	Thu 15.3.18	Tue 3.4.18	40 312,10 лв.
296	Crushed stone 0/40 for sidewalks	Трошен камък 0/40 за тротоари	m3	512,9	102,58	5 dys	Wed 4.4.18	Sun 8.4.18	24 220,64 лв.
297	Delivery and placing of concrete kerbs 8/16	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16	m	728,46	45,53	16 dys	Mon 9.4.18	Tue 24.4.18	12 961,81 лв.
298	Asphalt laying on the road - asphalt mixture for the base layer of type Ao	Доставка и полагане на асфалтова смес - асфалтова смес за основен пласт Тип Ао	t	1456,92	161,88	9 dys	Wed 4.4.18	Thu 12.4.18	157 257,86 лв.
299	Biaxial geogrid of fiberglass	Доставка и полагане на усилваща биаксиална геомрежа от фибростъкло	m2	2262,06	377,01	6 dys	Fri 13.4.18	Wed 18.4.18	15 110,38 лв.
300	Asphalt laying on the road - asphalt mixture for the lower layer of the covering 0/16 /binder/, with polymer modified bitumen	Доставка и полагане на асфалтова смес - асфалтова смес за долен пласт на покритието 0/16 /биндер/, с полимермодифициран битум	t	760,41	190,1	4 dys	Fri 13.4.18	Mon 16.4.18	99 440,68 лв.
301	Mound of sandy clay and humus for dividing strip and green areas	План за временна организация на движение на всички етапи		0	0	0 dys	Mon 16.4.18	Mon 16.4.18	0,00 лв.
302	Trial stretch of dense asphaltic concrete	Пробен участък за плътен асфалтобетон		0	0	3 dys	Tue 17.4.18	Thu 19.4.18	0,00 лв.
303	Asphalt laying on the road - dense asphalt concrete of type A, with polymer modified bitumen	Доставка и полагане на асфалтова смес - плътен асфалтобетон тип А, с полимермодифициран битум	m2	24779,4	1906,11	13 dys	Fri 27.4.18	Wed 9.5.18	352 363,07 лв.
304	Delivery and placing of tactile tiles	Доставка и полагане на тактилни плочи	m2	109	10,9	10 dys	Thu 10.5.18	Sat 19.5.18	9 880,09 лв.
305	Poles for street lighting and traffic lights	Стълбове за улично осветление и за светофари	lump	0	0	8 dys	Sun 20.5.18	Sun 27.5.18	31 880,81 лв.
306	Asphalt laying on the sidewalks	Плътен асфалтобетон за тротоар	m2	3854,34	770,87	5 dys	Mon 28.5.18	Fri 1.6.18	48 916,71 лв.
307	Street lighting and traffic lights	Кабелни трасета за улично осветление и светофари	lump	0	0	24 dys	Sat 25.11.17	Mon 18.12.17	31 880,81 лв.
308	Humus and Greenery	Хумус и озеленяване	m3	197,25	24,66	8 dys	Sat 2.6.18	Sat 9.6.18	7 195,50 лв.
309	Installation of cables and lamps for street lighting and installation of cables for lights	Монтаж на кабели и осветителни тела за улично осветление и монтаж на кабели за светофари	lump	0	0	7 dys	Sun 10.6.18	Sat 16.6.18	31 880,81 лв.
310	Traffic signs and road marking	Пътни знаци и маркировка	lump	1		8 dys	Sat 2.6.18	Sat 9.6.18	42 330,68 лв.
311	Cleaning of the site	Почистване на площадката		0		11 dys	Sun 17.6.18	Wed 27.6.18	0,00 лв.
312	**TAKING OVER**	**ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДАВАНЕ НА УЧАСТЪКА**		**0**		**54 dys**	**Sat 19.5.18**	**Wed 11.7.18**	**0,00 лв.**
313	Built in drawings	Изготвяне екзекутивни чертежи		0		40 dys	Sat 19.5.18	Wed 27.6.18	0,00 лв.
314	Notice of completion of works	Известие за завършване на работата		0		0 dys	Thu 7.6.18	Thu 7.6.18	0,00 лв.
315	Testing for taking over	Проверки преди приемането		0		14 dys	Thu 28.6.18	Wed 11.7.18	0,00 лв.
316	Taking over certificate	Заключителен сертификат		0		0 dys	Wed 11.7.18	Wed 11.7.18	0,00 лв.
317	**Construction works of Shesti Septemvri Blvd**	**Строителни работи на на бул. „Шести септември"**		**0**		**717 dys**	**Sun 31.7.16**	**Tue 17.7.18**	**6 084 600,80 лв.**
318	**Reconstruction of Shesti Septemvri Blvd in the section from Adata Bridge to Tsarigradsko shose Blvd in Plovdiv /Section 1 (from Adata Bridge to roundjunction north lane)/**	**Реконструкция на бул „Шести септември" в участъка от мост „Адата" до бул "Цариградско шосе" в гр Пловдив /Участък 1 (от мост "Адата" до кръгово кръстовище северно платно)/**	**Етап 1**	**0**		**224 dys**	**Sun 31.7.16**	**Sat 11.3.17**	**555 697,48 лв.**
319	**PART ROAD**	**ЧАСТ ПЪТНА**		**0**		**217 dys**	**Sun 31.7.16**	**Sat 4.3.17**	**302 391,26 лв.**
320	Notice of initiation and project TTO	Известие за започване и проект за ВОД		0	0	0 dys	Sun 31.7.16	Sun 31.7.16	0,00 лв.
321	Access to the site	Достъп до строителната площадка		0	0	0 dys	Mon 15.8.16	Mon 15.8.16	0,00 лв.
322	TTO	Пътни знаци и ВОД	pcs	66	33	2 dys	Mon 15.8.16	Tue 16.8.16	2 869,80 лв.
323	Cleaning of the construction site	Почистване на строителната площ	m2	5242,59	1747,53	3 dys	Wed 17.8.16	Fri 19.8.16	1 607,73 лв.
324	Milling of asphalt pavement	Фрезоване на асфалтова настилка	m2	291,06	291,06	1 dy	Sat 20.8.16	Sat 20.8.16	0,00 лв.
325	Demolition of asphalt pavement	Разваляне на асфалтова настилка	m3	345,33	345,33	1 dy	Sat 20.8.16	Sat 20.8.16	5 061,21 лв.
326	Demolition of paving-block pavement	Разваляне на паважна настилка	m2	560	280	2 dys	Sun 21.8.16	Mon 22.8.16	0,00 лв.
327	Demolition of sidewalks of tiles, asphalt and concrete	Разваляне на тротоари от плочки, асфалт и бетон	m2	1969,92	492,48	4 dys	Sun 30.10.16	Wed 2.11.16	5 861,13 лв.
328	Demolition of kerbs and strips	Разваляне на бордюри и ивици	m	316,31	105,44	3 dys	Tue 23.8.16	Thu 25.8.16	0,00 лв.
329	Demolition of the base of the pavement	Разваляне на основата на настилката	m3	1670,76	556,92	3 dys	Tue 23.8.16	Thu 25.8.16	10 071,32 лв.
330	Excavation for a road of unacceptable material in earth soils	Изкоп за път на неподходящ материал в земни почви	m3	720,77	360,38	2 dys	Fri 26.8.16	Sat 27.8.16	3 232,09 лв.
331	Embankment for road of acceptable material	Насип за път от подходящ материал	m3	127,58	63,79	2 dys	Sun 28.8.16	Mon 29.8.16	159,68 лв.
332	Profiling of the earth bed	Профилиране на земното легло	m2	3607,74	1202,58	3 dys	Sun 28.8.16	Tue 30.8.16	668,52 лв.
333	Crushed stone (0-40) d= 42 cm	Несортиран трошен камък (0-40) d=42 см	m3	1443,56	22,91	63 dys	Wed 31.8.16	Tue 1.11.16	41 793,72 лв.
334	Crushed stone under curbs, road strips, etc	Несортиран трошен камък под бордюри, пътни ивици,	m3	317,93	4,75	67 dys	Wed 31.8.16	Sat 5.11.16	8 462,24 лв.
335	Concrete kerbs and road strips	Бетонови бордюри и пътни ивици	m	800	12,7	63 dys	Mon 5.9.16	Sun 6.11.16	19 006,90 лв.
336	Crushed stone sidewalk (0-40) d= 30 cm	Несортиран трошен камък (0-40) d=30 см	m3	548,24	91,37	6 dys	Sun 13.11.16	Fri 18.11.16	16 882,37 лв.
337	Geogrid 55 kN/m	Геомрежа с якост 55 kN/m в двете посоки	m2	61,56	61,56	1 dy	Fri 11.11.16	Fri 11.11.16	0,00 лв.
338	Asphalt mixture laying on road - Bituminous crushed stone Ao	Полагане асфалт на пътя - Битумизиран трошен камък Ао	t	1228,77	307,19	4 dys	Sun 20.11.16	Wed 23.11.16	118 805,88 лв.
339	Asphalt mixture laying bituminous crushed stone Ao-sidewalks	Полагане асфалт битумизиран трошен камък Ао на тротоар	t	169,43	169,43	1 dy	Sat 19.11.16	Sat 19.11.16	15 760,28 лв.
340	Asphalt mixture laying on road - Binder	Полагане асфалт на пътя - Неплътен асфалтобетон	t	291,59	145,79	2 dys	Thu 24.11.16	Fri 25.11.16	30 515,10 лв.
341	Sidewalk tiles and paving-blocks	Тротоарни плочи и тротоарни павета	m2	308,09	20,54	15 dys	Wed 23.11.16	Wed 7.12.16	8 593,01 лв.
342	Embankment of sandy clay and greenery on the central reserve	Насип от песъчлива глина и хумус за разделителна ивица и зелени площи	m3	317,25	79,31	4 dys	Thu 8.12.16	Sun 11.12.16	2 898,38 лв.
343	Asphalt mixture laying dense asphalt concrete, type A - sidewalks	Полагане асфалт плътен асфалтобетон тип А на тротоар	m2	1036	259	4 dys	Wed 1.3.17	Sat 4.3.17	10 141,90 лв.
344	**PART WSS**	**ЧАСТ ВИК**		**0**		**30 dys**	**Fri 26.8.16**	**Sat 24.9.16**	**87 259,11 лв.**
345	**DRAINAGE**	**ОТВОДНЯВАНЕ**		**0**		**30 dys**	**Fri 26.8.16**	**Sat 24.9.16**	**87 259,11 лв.**
346	Excavation of channel, installation of pipes and backfilling	Изкоп на канал за доставка и монтаж на тръби и обратно засипване	m	338	11,27	30 dys	Fri 26.8.16	Sat 24.9.16	87 259,11 лв.
347	**PART ELECTROTECHNICAL**	**ЧАСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА**		**0**		**72 dys**	**Sun 25.9.16**	**Mon 5.12.16**	**166 047,11 лв.**
348	Street lignthing	Изграждане на кабелни трасета	lump	1	0,05	10 dys	Thu 10.11.16	Sat 19.11.16	9 662,45 лв.
349	Installation of poles	Монтаж на стълбове	lump	0	0	5 dys	Sat 26.11.16	Wed 30.11.16	9 662,45 лв.
350	Installation of cables and fixtures	Монтаж на кабели и осветителни тела	lump	0	0	5 dys	Thu 1.12.16	Mon 5.12.16	9 662,45 лв.
351	Pipe-Channel network and moving of existing equipment	Тръбна канална мрежа и изместване на съществуващи съоръжения	m	400	16	25 dys	Sun 25.9.16	Wed 19.10.16	137 059,76 лв.
352	Cleaning of the construction site	Почистване на строителната площ		0	0	7 dys	Sun 5.3.17	Sat 11.3.17	0,00 лв.
353	Prepare for temporary traffic operation	Подготовка за трафик		0	0	0 dys	Mon 12.12.16	Mon 12.12.16	0,00 лв.
354	**Reconstruction of Shesti Septemvri Blvd in the section from Adata Bridge to Tsarigradsko shose Blvd in Plovdiv /Section 2 (from Adata Bridge to roundjunction south lane; roundjunction; from roundjunction to Maritsa Blvd. west lane; Vladaia Str.)/**	**Реконструкция на бул „Шести септември" в участъка от мост „Адата" до бул "Цариградско шосе" в гр Пловдив /Участък 2 (от мост "Адата" до кръгово южно платно; кръгово кръстовище; от кръгово кръстовище до бул. "Марица" западно платно; ул. "Владая")/**	**Етап 2**	**0**		**168 dys**	**Mon 28.11.16**	**Sun 14.5.17**	**1 581 656,18 лв.**
355	**PART ROAD**	**ЧАСТ ПЪТНА**		**0**		**153 dys**	**Mon 28.11.16**	**Sat 29.4.17**	**797 702,50 лв.**
356	Notice of initiation and project TTO	Известие за започване и проект за ВОД		0	0	0 dys	Mon 28.11.16	Mon 28.11.16	0,00 лв.
357	Access to the site	Достъп до строителната площадка		0		0 dys	Mon 12.12.16	Mon 12.12.16	0,00 лв.
358	TTO	Пътни знаци и ВОД	pcs	66	33	2 dys	Tue 13.12.16	Wed 14.12.16	2 869,80 лв.
359	Cleaning of the construction site	Почистване на строителната площ	m2	11009,44	3669,81	3 dys	Tue 13.12.16	Thu 15.12.16	6 853,45 лв.
360	Milling of asphalt pavement	Фрезоване на асфалтова настилка	m2	1668,72	556,24	3 dys	Fri 16.12.16	Sun 18.12.16	2 379,07 лв.
361	Demolition of asphalt pavement	Разваляне на асфалтова настилка	m3	725,2	241,73	3 dys	Fri 16.12.16	Sun 18.12.16	14 105,74 лв.
362	Demolition of paving-block pavement	Разваляне на паважна настилка	m2	4867,7	1622,57	3 dys	Mon 19.12.16	Wed 21.12.16	2 826,17 лв.
363	Demolition of sidewalks of tiles, asphalt and concrete	Разваляне на тротоари от плочки, асфалт и бетон	m2	4226,83	1056,71	4 dys	Thu 22.12.16	Sun 25.12.16	16 197,79 лв.
364	Demolition of kerbs and strips	Разваляне на бордюри и ивици	m	1084,25	361,42	3 dys	Thu 22.12.16	Sat 24.12.16	4 645,44 лв.
365	Demolition of the base of the pavement	Разваляне на основата на настилката	m3	3508,59	1169,53	3 dys	Thu 22.12.16	Sat 24.12.16	24 626,98 лв.
366	Excavation for a road of unacceptable material in earth soils	Изкоп за път на неподходящ материал в земни почви	m3	1513,61	504,54	3 dys	Mon 26.12.16	Wed 28.12.16	10 264,59 лв.
367	Demolition of buildings	Разрушаване на сгради		0		0 dys	Wed 15.2.17	Wed 15.2.17	0,00 лв.
368	Heating pipes rehabilitation completion	Приключване на топлофикация		0		0 dys	Wed 15.2.17	Wed 15.2.17	0,00 лв.
369	Profiling of the earth bed	Профилиране на земното легло	m2	7576,26	1894,07	4 dys	Wed 15.2.17	Sat 18.2.17	4 881,11 лв.
370	Embankment for road of acceptable material	Насип за път от подходящ материал	m3	267,91	133,96	2 dys	Sun 19.2.17	Mon 20.2.17	3 812,53 лв.
371	Crushed stone (0-40) d= 42 cm	Несортиран трошен камък (0-40) d= 42 см	m3	3031,47	303,15	10 dys	Tue 21.2.17	Thu 2.3.17	93 750,81 лв.
372	Crushed stone under curbs, road strips, etc	Несортиран трошен камък под бордюри, пътни ивици,	m3	667,65	222,55	3 dys	Fri 3.3.17	Sun 5.3.17	21 247,91 лв.
373	Concrete kerbs and road strips	Бетонови бордюри и пътни ивици	m	1486	74,3	20 dys	Sat 11.3.17	Thu 30.3.17	99 129,05 лв.
374	Crushed stone (0-40) d= 30 cm	Несортиран трошен камък (0-40) d=30 см	m3	1151,3	191,88	6 dys	Fri 31.3.17	Wed 5.4.17	38 930,20 лв.
375	Geogrid 55 kN/m	Геомрежа с якост 55 kN/m в двете посоки	m2	129,27	25,85	5 dys	Sun 26.2.17	Thu 2.3.17	0,00 лв.
376	<New Task>	Пробен участък за Ао		0	0	1 dy	Fri 31.3.17	Fri 31.3.17	0,00 лв.
377	Asphalt mixture laying on road - Bituminous crushed stone Ao	Полагане асфалт на пътя - Битумизиран трошен камък Ао	t	2580,42	645,11	4 dys	Thu 6.4.17	Sun 9.4.17	263 321,05 лв.
378	Asphalt mixture laying bituminous crushed stone Ao-sidewalks	Полагане асфалт битумизиран трошен камък Ао на тротоар	t	355,8	177,9	2 dys	Mon 10.4.17	Tue 11.4.17	36 573,81 лв.
379	<New Task>	Пробен участък за неплътен асфалт		0	0	1 dy	Mon 10.4.17	Mon 10.4.17	0,00 лв.
380	Asphalt mixture laying on road - Binder	Полагане асфалт на пътя - Неплътен асфалтобетон	t	713,87	356,94	2 dys	Thu 13.4.17	Fri 14.4.17	79 203,40 лв.
381	Sidewalk tiles and paving-blocks	Тротоарни плочи и тротоарни павета	m2	736,94	92,12	8 dys	Wed 12.4.17	Wed 19.4.17	23 838,21 лв.
382	Embankment of sandy clay and greenery on the central reserve	Насип от песъчлива глина и хумус за разделителна ивица и зелени площи	m3	634,5	158,63	4 dys	Thu 20.4.17	Sun 23.4.17	8 957,85 лв.
383	Asphalt mixture laying dense asphalt concrete, type A - sidewalks	Полагане асфалт плътен асфалтобетон тип А на тротоар	m2	2072	518	4 dys	Mon 24.4.17	Thu 27.4.17	23 444,90 лв.
384	Red asphalt mixture laying - Dense asphalt concrete, type A for bicycle lanes	Полагане оцветен червен асфалт - Плътен асфалтобетон тип А за велоалеи	m2	541,5	270,75	2 dys	Fri 28.4.17	Sat 29.4.17	15 842,64 лв.
385	**PART WSS**	**ЧАСТ ВИК**		**0**		**28 dys**	**Sat 21.1.17**	**Fri 17.2.17**	**375 302,58 лв.**
386	**WATER MAIN**	**ВОДОПРОВОД**		**0**		**25 dys**	**Sat 21.1.17**	**Wed 15.2.17**	**152 214,79 лв.**
387	Excavation of channel, installation of pipes and backfilling	Изкоп на канал за доставка и монтаж на тръби и обратно засипване	m	580	23,2	25 dys	Sat 21.1.17	Wed 15.2.17	152 214,79 лв.
388	**DRAINAGE**	**ОТВОДНЯВАНЕ**		**0**		**28 dys**	**Sat 21.1.17**	**Fri 17.2.17**	**223 087,79 лв.**
389	Excavation of channel, installation of pipes and backfilling	Изкоп на канал за доставка и монтаж на тръби и обратно засипване	m	829,88	33,2	25 dys	Sat 21.1.17	Tue 14.2.17	220 099,89 лв.
390	Surveying and testing of sewage	Заснемане и изпитване на канализация	m	829,88	276,63	3 dys	Wed 15.2.17	Fri 17.2.17	2 987,90 лв.
391	**PART ELECTROTECHNICAL**	**ЧАСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА**		**0**		**86 dys**	**Sat 18.2.17**	**Sun 14.5.17**	**408 651,10 лв.**
392	Traffic lights at km 0+000.00	Светофарна уредба на км. 0+000.00	lump	1	0,1	10 dys	Sat 11.3.17	Mon 20.3.17	48 471,42 лв.
393	Installation of poles	Монтаж на стълбове	lump	0	0	5 dys	Sun 30.4.17	Thu 4.5.17	21 450,21 лв.
394	Installation of cables and fixtures	Монтаж на кабели и осветителни тела	lump	0	0	5 dys	Fri 5.5.17	Tue 9.5.17	21 450,21 лв.
395	Pipe-Channel network and moving of existing equipment	Тръбна канална мрежа и изместване на съществуващи съоръжения	m	885	42,14	21 dys	Sat 18.2.17	Fri 10.3.17	317 279,26 лв.
396	Cleaning of the construction site	Почистване на строителната площ		0	0	5 dys	Wed 10.5.17	Sun 14.5.17	0,00 лв.
397	Prepare for temporary traffic operation	Подготовка за трафик		0	0	0 dys	Sun 14.5.17	Sun 14.5.17	0,00 лв.
398	**Reconstruction of Shesti Septemvri Blvd in the section from Adata Bridge to Tsarigradsko shose Blvd in the town of Plovdiv, Plovdiv Municipality /Section 3 (part of roundjunction; from roundjunction to Maritsa Blvd. east lane)/**	**Реконструкция на бул „Шести септември" в участъка от мост „Адата" до бул "Цариградско шосе" в гр Пловдив /Участък 3 (част от кръгово кръстовище; от кръгово кръстовище до бул. "Марица" източно платно)/**	**Етап 3**	**0**		**136 dys**	**Mon 1.5.17**	**Wed 13.9.17**	**491 227,68 лв.**
399	**PART ROAD**	**ЧАСТ ПЪТНА**		**0**		**125 dys**	**Mon 1.5.17**	**Sat 2.9.17**	**245 314,42 лв.**
400	Design of TTO and notice of work beggining	Известие за започване и проект за ВОД		0		0 dys	Mon 1.5.17	Mon 1.5.17	0,00 лв.
401	Access to the site	Достъп до строителната площадка		0		0 dys	Sun 14.5.17	Sun 14.5.17	0,00 лв.
402	TTO	Пътни знаци и ВОД	pcs	66	33	2 dys	Mon 15.5.17	Tue 16.5.17	2 869,80 лв.
403	Cleaning of the construction site	Почистване на строителната площ	m2	4019,32	1339,77	3 dys	Mon 15.5.17	Wed 17.5.17	495,01 лв.
404	Milling of asphalt pavement	Фрезоване на асфалтова настилка	m2	223,15	74,38	3 dys	Thu 18.5.17	Sat 20.5.17	0,00 лв.
405	Demolition of asphalt pavement	Разваляне на асфалтова настилка	m3	264,76	88,25	3 dys	Thu 18.5.17	Sat 20.5.17	2 167,39 лв.
406	Demolition of paving-block pavement	Разваляне на паважна настилка	m2	1777,1	592,37	3 dys	Sun 21.5.17	Tue 23.5.17	0,00 лв.
407	Demolition of sidewalks of tiles, asphalt and concrete	Разваляне на тротоари от плочки, асфалт и бетон	m2	1510,27	377,57	4 dys	Wed 24.5.17	Sat 27.5.17	2 340,83 лв.
408	Demolition of kerbs and strips	Разваляне на бордюри и ивици	m	242,5	80,83	3 dys	Wed 24.5.17	Fri 26.5.17	0,00 лв.
409	Demolition of the base of the pavement	Разваляне на основата на настилката	m3	1280,92	426,97	3 dys	Wed 24.5.17	Fri 26.5.17	6 143,52 лв.
410	Excavation for a road of unacceptable material in earth soils	Изкоп за път на неподходящ материал в земни почви	m3	552,59	184,2	3 dys	Sun 28.5.17	Tue 30.5.17	1 740,34 лв.
411	Profiling of the earth bed	Профилиране на земното легло	m2	2765,93	691,48	4 dys	Wed 31.5.17	Sat 3.6.17	0,00 лв.
412	Embankment for road of acceptable material	Насип за път от подходящ материал	m3	97,81	48,91	2 dys	Sun 4.6.17	Mon 5.6.17	0,00 лв.
413	Crushed stone (0-40) d= 42 cm	Несортиран трошен камък (0-40) d=42 см	m3	1106,73	73,78	15 dys	Sat 15.7.17	Sat 29.7.17	29 799,17 лв.
414	Crushed stone under curbs, road strips, etc	Несортиран трошен камък под бордюри, пътни ивици,	m3	243,74	16,25	15 dys	Sat 15.7.17	Sat 29.7.17	5 750,13 лв.
415	Concrete kerbs and road strips	Бетонови бордюри и пътни ивици	m	1242,79	82,85	15 dys	Sun 30.7.17	Sun 13.8.17	31 276,65 лв.
416	Crushed stone (0-40) d= 30 cm	Несортиран трошен камък (0-40) d=30 см	m3	420,32	70,05	6 dys	Mon 14.8.17	Sat 19.8.17	12 205,56 лв.
417	Geogrid 55 kN/m	Геомрежа с якост 55 kN/m в двете посоки	m2	47,2	3,15	15 dys	Sat 15.7.17	Sat 29.7.17	0,00 лв.
418	Asphalt mixture laying on road - Bituminous crushed stone Ao	Полагане асфалт на пътя - Битумизиран трошен камък Ао	t	942,06	471,03	2 dys	Mon 14.8.17	Tue 15.8.17	91 291,99 лв.
419	Asphalt mixture laying bituminous crushed stone Ao-sidewalks	Полагане асфалт битумизиран трошен камък Ао на тротоар	t	129,89	129,89	1 dy	Sun 20.8.17	Sun 20.8.17	11 345,29 лв.
420	Asphalt mixture laying on road - Binder	Полагане асфалт на пътя - Неплътен асфалтобетон	t	223,56	111,78	2 dys	Mon 21.8.17	Tue 22.8.17	22 657,32 лв.
421	Sidewalk tiles and paving-blocks	Тротоарни плочи и тротоарни павета	m2	236,19	59,05	4 dys	Mon 21.8.17	Thu 24.8.17	5 850,37 лв.
422	Embankment of sandy clay and greenery on the central reserve	Насип от песъчлива глина и хумус за разделителна ивица и зелени площи	m3	317,25	79,31	4 dys	Fri 25.8.17	Mon 28.8.17	2 898,38 лв.
423	Asphalt mixture laying dense asphalt concrete, type A - sidewalks	Полагане асфалт плътен асфалтобетон тип А на тротоар	m2	1036	345,33	3 dys	Tue 29.8.17	Thu 31.8.17	10 141,90 лв.
424	Red asphalt mixture laying - Dense asphalt concrete, type A for bicycle lanes	Полагане оцветен червен асфалт - Плътен асфалтобетон тип А за велоалеи	m2	270,75	135,38	2 dys	Fri 1.9.17	Sat 2.9.17	6 340,77 лв.
425	**PART WSS**	**ЧАСТ ВИК**		**0**		**28 dys**	**Sun 28.5.17**	**Sat 24.6.17**	**71 258,90 лв.**
426	**DRAINAGE**	**ОТВОДНЯВАНЕ**		**0**		**28 dys**	**Sun 28.5.17**	**Sat 24.6.17**	**71 258,90 лв.**
427	Excavation of channel, installation of pipes and backfilling	Изкоп на канал за доставка и монтаж на тръби и обратно засипване	m	276,63	11,07	25 dys	Sun 28.5.17	Wed 21.6.17	71 258,90 лв.
428	Surveying and testing of sewage	Заснемане и изпитване на канализация	m	276,63	92,21	3 dys	Thu 22.6.17	Sat 24.6.17	0,00 лв.
429	**PART ELECTROTECHNICAL**	**ЧАСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА**		**0**		**81 dys**	**Sun 25.6.17**	**Wed 13.9.17**	**174 654,36 лв.**
430	Street lignthing	Изграждане на кабелни трасета	lump	1	0,1	10 dys	Sat 15.7.17	Mon 24.7.17	7 162,00 лв.
431	Installation of poles	Монтаж на стълбове	lump	0	0	5 dys	Fri 1.9.17	Tue 5.9.17	7 162,00 лв.
432	Installation of cables and fixtures	Монтаж на кабели и осветителни тела	lump	0	0	5 dys	Wed 6.9.17	Sun 10.9.17	7 162,00 лв.
433	Pipe-Channel network and moving of existing equipment	Тръбна канална мрежа и изместване на съществуващи съоръжения	m	220	11	20 dys	Sun 25.6.17	Fri 14.7.17	104 882,93 лв.
434	Traffic lights	Светофарна уредба	lump	1	0,1	10 dys	Tue 25.7.17	Thu 3.8.17	48 285,43 лв.
435	Cleaning of the construction site	Почистване на строителната площ		0	0	3 dys	Mon 11.9.17	Wed 13.9.17	0,00 лв.
436	Prepare for temporary traffic operation	Подготовка за трафик		0	0	0 dys	Wed 13.9.17	Wed 13.9.17	0,00 лв.
437	**Reconstruction of Shesti Septemvri Blvd in the section from Adata Bridge to Tsarigradsko shose Blvd in Plovdiv /Section 4 (from roundjunction to Orlovets Str.; east part of the bridge Adata)/**	**Реконструкция на бул „Шести септември" в участъка от мост „Адата" до бул "Цариградско шосе" в гр Пловдив /Участък 4 (от кръгово кръстовище до ул. "Орловец"; източна част от мота "Адата")/**	**Етап 4**	**0**		**197 dys**	**Thu 31.8.17**	**Thu 15.3.18**	**1 080 105,33 лв.**
438	**PART ROAD**	**ЧАСТ ПЪТНА**		**0**		**192 dys**	**Thu 31.8.17**	**Sat 10.3.18**	**701 580,07 лв.**
439	Design of TTO and notice of work beggining	Известие за започване и проект за ВОД		0		0 dys	Thu 31.8.17	Thu 31.8.17	0,00 лв.
440	Access to the site	Достъп до строителната площадка		0		0 dys	Wed 13.9.17	Wed 13.9.17	0,00 лв.
441	Completion of Toplofikacia	Приключване на Топлофикация		0	0	0 dys	Wed 13.9.17	Wed 13.9.17	0,00 лв.
442	TTO	Пътни знаци и ВОД	pcs	66	33	2 dys	Thu 14.9.17	Fri 15.9.17	2 869,80 лв.
443	Cleaning of the construction site	Почистване на строителната площ	m2	9164,82	3054,94	3 dys	Thu 14.9.17	Sat 16.9.17	5 175,53 лв.
444	Milling of asphalt pavement	Фрезоване на асфалтова настилка	m2	2095,07	698,36	3 dys	Sun 17.9.17	Tue 19.9.17	3 794,52 лв.
445	Demolition of asphalt pavement	Разваляне на асфалтова настилка	m3	603,69	201,23	3 dys	Sun 17.9.17	Tue 19.9.17	11 212,71 лв.
446	Demolition of paving-block pavement	Разваляне на паважна настилка	m2	4052,12	1350,71	3 dys	Wed 20.9.17	Fri 22.9.17	1 823,01 лв.
447	Demolition of steel guard rail	Разваляне на стоманена ограда	m	120	60	2 dys	Wed 20.9.17	Thu 21.9.17	0,00 лв.
448	Demolition of sidewalks of tiles, asphalt and concrete	Разваляне на тротоари от плочки, асфалт и бетон	m2	3578,71	894,68	4 dys	Fri 22.9.17	Mon 25.9.17	13 229,40 лв.
449	Demolition of kerbs and strips	Разваляне на бордюри и ивици	m	1182,95	394,32	3 dys	Fri 22.9.17	Sun 24.9.17	5 356,13 лв.
450	Demolition of the base of the pavement	Разваляне на основата на настилката	m3	2920,74	730,18	4 dys	Fri 22.9.17	Mon 25.9.17	19 971,13 лв.
451	Excavation for a road of unacceptable material in earth soils	Изкоп за път на неподходящ материал в земни почви	m3	1260	420	3 dys	Tue 26.9.17	Thu 28.9.17	8 015,14 лв.
452	Profiling of the earth bed	Профилиране на земното легло	m2	6306,86	1261,37	5 dys	Fri 29.9.17	Tue 3.10.17	3 303,34 лв.
453	Embankment for road of acceptable material	Насип за път от подходящ материал	m3	223,02	111,51	2 dys	Wed 4.10.17	Thu 5.10.17	2 644,11 лв.
454	Crushed stone (0-40) d= 42 cm	Несортиран трошен камък (0-40) d=42 см	m3	2523,55	168,24	15 dys	Wed 15.11.17	Wed 29.11.17	74 941,45 лв.
455	Crushed stone under curbs, road strips, etc	Несортиран трошен камък под бордюри, пътни ивици,	m3	555,78	37,05	15 dys	Wed 15.11.17	Wed 29.11.17	17 158,22 лв.
456	Concrete kerbs and road strips	Бетонови бордюри и пътни ивици	m	3346,63	223,11	15 dys	Thu 30.11.17	Thu 14.12.17	89 574,10 лв.
457	Crushed stone (0-40) d= 30 cm	Несортиран трошен камък (0-40) d=30 см	m3	958,4	159,73	6 dys	Fri 15.12.17	Wed 20.12.17	31 877,86 лв.
458	Geogrid 55 kN/m	Геомрежа с якост 55 kN/m в двете посоки	m2	107,62	7,17	15 dys	Wed 15.11.17	Wed 29.11.17	0,00 лв.
459	<New Task>	Пробен участък за битумизиран камък		0	0	1 dy	Thu 1.2.18	Thu 1.2.18	0,00 лв.
460	Asphalt mixture laying on road - Bituminous crushed stone Ao	Полагане асфалт на пътя - Битумизиран трошен камък Ао	t	2148,07	537,02	4 dys	Wed 7.2.18	Sat 10.2.18	216 257,00 лв.
461	Asphalt mixture laying bituminous crushed stone Ao-sidewalks	Полагане асфалт битумизиран трошен камък Ао на тротоар	t	296,18	148,09	2 dys	Sun 11.2.18	Mon 12.2.18	29 916,28 лв.
462	<New Task>	Пробен участък за неплътен асфалт		0	0	1 dy	Tue 13.2.18	Tue 13.2.18	0,00 лв.
463	Asphalt mixture laying on road - Binder	Полагане асфалт на пътя - Неплътен асфалтобетон	t	662,03	165,51	4 dys	Sat 17.2.18	Tue 20.2.18	73 176,60 лв.
464	Sidewalk tiles and paving-blocks	Тротоарни плочи и тротоарни павета	m2	673,55	134,71	5 dys	Tue 13.2.18	Sat 17.2.18	20 860,40 лв.
465	Embankment of sandy clay and greenery on the central reserve	Насип от песъчлива глина и хумус за разделителна ивица и зелени площи	m3	634,5	158,63	4 dys	Wed 21.2.18	Sat 24.2.18	8 957,85 лв.
466	Asphalt mixture laying dense asphalt concrete, type A - sidewalks	Полагане асфалт плътен асфалтобетон тип А на тротоар	m2	2072	518	4 dys	Sun 25.2.18	Wed 28.2.18	23 444,90 лв.
467	Red asphalt mixture laying - Dense asphalt concrete, type A for bicycle lanes	Полагане оцветен червен асфалт - Плътен асфалтобетон тип А за велоалеи	m2	541,5	135,38	4 dys	Thu 1.3.18	Sun 4.3.18	15 842,64 лв.
468	Steel guard rail ЕПО 40 with driven posts	Стоманена предпазна ограда ЕПО 4.0 с набиване на с	m	120	30	4 dys	Mon 5.3.18	Thu 8.3.18	4 924,50 лв.
469	Sidewalk lattice railing with height of H = 810 mm	Тротоарен решетъчен парапет с височина H = 810 мм	m	377	62,83	6 dys	Mon 5.3.18	Sat 10.3.18	17 253,45 лв.
470	**PART WSS**	**ЧАСТ ВИК**		**0**		**30 dys**	**Tue 26.9.17**	**Wed 25.10.17**	**80 575,56 лв.**
471	**DRAINAGE**	**ОТВОДНЯВАНЕ**		**0**		**30 dys**	**Tue 26.9.17**	**Wed 25.10.17**	**80 575,56 лв.**
472	Excavation of channel, installation of pipes and backfilling	Изкоп на канал за доставка и монтаж на тръби и обратно засипване	m	315,5	12,62	25 dys	Tue 26.9.17	Fri 20.10.17	80 575,56 лв.
473	Surveying and testing of sewage	Заснемане и изпитване на канализация	m	315,5	63,1	5 dys	Sat 21.10.17	Wed 25.10.17	0,00 лв.
474	**PART ELECTROTECHNICAL**	**ЧАСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА**		**0**		**141 dys**	**Thu 26.10.17**	**Thu 15.3.18**	**297 949,70 лв.**
475	Street lignthing	Изграждане на кабелни трасета	lump	1	0,1	10 dys	Wed 15.11.17	Fri 24.11.17	17 679,71 лв.
476	Installation of poles	Монтаж на стълбове	lump	0	0	5 dys	Thu 1.3.18	Mon 5.3.18	17 679,71 лв.
477	Installation of cables and fixtures	Монтаж на кабели и осветителни тела	lump	0	0	5 dys	Tue 6.3.18	Sat 10.3.18	17 679,71 лв.
478	Pipe-Channel network and moving of existing equipment	Тръбна канална мрежа и изместване на съществуващи съоръжения	m	340	17	20 dys	Thu 26.10.17	Tue 14.11.17	244 910,57 лв.
479	Cleaning of the construction site	Почистване на строителната площ		0	0	5 dys	Sun 11.3.18	Thu 15.3.18	0,00 лв.
480	Prepare for temporary traffic operation	Подготовка за трафик		0	0	0 dys	Thu 15.3.18	Thu 15.3.18	0,00 лв.
481	**Reconstruction of Shesti Septemvri Blvd in the section from Adata Bridge to Tsarigradsko shose Blvd in Plovdiv /Section 5 (from Orlovets Str. to Tsarigradsko shose Blvd.; west part of the bridge Adata)/**	**Реконструкция на бул „Шести септември" в участъка от мост „Адата" до бул "Цариградско шосе" в гр Пловдив /Участък 5 (от ул. "Орловец" до бул "Цариградско шосе"; западна част от мота "Адата")/**	**Етап 5**	**0**		**138 dys**	**Fri 2.3.18**	**Tue 17.7.18**	**2 375 914,13 лв.**
482	**PART ROAD**	**ЧАСТ ПЪТНА**		**0**		**117 dys**	**Fri 2.3.18**	**Tue 26.6.18**	**1 953 804,75 лв.**
483	Design of TTO and notice of work beggining	Известие за започване и проект за ВОД		0		0 dys	Fri 2.3.18	Fri 2.3.18	0,00 лв.
484	Access to the site	Достъп до строителната площадка		0		0 dys	Thu 15.3.18	Thu 15.3.18	0,00 лв.
485	Completion of Toplofikacia	Приключване на Топлофикация		0	0	0 dys	Thu 15.3.18	Thu 15.3.18	0,00 лв.
486	TTO	Пътни знаци и ВОД	pcs	66	22	3 dys	Fri 16.3.18	Sun 18.3.18	2 869,80 лв.
487	Cleaning of the construction site	Почистване на строителната площ	m2	9397,83	3132,61	3 dys	Fri 16.3.18	Sun 18.3.18	5 387,48 лв.
488	Milling of asphalt pavement	Фрезоване на асфалтова настилка	m2	2108	702,67	3 dys	Mon 19.3.18	Wed 21.3.18	3 837,47 лв.
489	Demolition of asphalt pavement	Разваляне на асфалтова настилка	m3	619,04	206,35	3 dys	Mon 19.3.18	Wed 21.3.18	11 578,15 лв.
490	Demolition of paving-block pavement	Разваляне на паважна настилка	m2	4155,14	1385,05	3 dys	Thu 22.3.18	Sat 24.3.18	1 949,72 лв.
491	Demolition of steel guard rail	Разваляне на стоманена ограда	m	120	40	3 dys	Thu 22.3.18	Sat 24.3.18	0,00 лв.
492	Demolition of sidewalks of tiles, asphalt and concrete	Разваляне на тротоари от плочки, асфалт и бетон	m2	3666,26	523,75	7 dys	Sun 25.3.18	Sat 31.3.18	13 630,40 лв.
493	Demolition of kerbs and strips	Разваляне на бордюри и ивици	m	1197,01	239,4	5 dys	Sun 25.3.18	Thu 29.3.18	5 457,34 лв.
494	Demolition of the base of the pavement	Разваляне на основата на настилката	m3	2994,99	599	5 dys	Sun 25.3.18	Thu 29.3.18	20 559,24 лв.
495	Excavation for a road of unacceptable material in earth soils	Изкоп за път на неподходящ материал в земни почви	m3	1292,04	258,41	5 dys	Fri 30.3.18	Tue 3.4.18	8 299,28 лв.
496	Profiling of the earth bed	Профилиране на земното легло	m2	6467,21	1293,44	5 dys	Wed 4.4.18	Sun 8.4.18	3 703,85 лв.
497	Embankment for road of acceptable material	Насип за път от подходящ материал	m3	228,69	76,23	3 dys	Mon 9.4.18	Wed 11.4.18	2 791,70 лв.
498	Crushed stone (0-40) d= 42 cm	Несортиран трошен камък (0-40) d=42 см	m3	2587,71	369,67	7 dys	Wed 2.5.18	Tue 8.5.18	821 521,99 лв.
499	Crushed stone under curbs, road strips, etc	Несортиран трошен камък под бордюри, пътни ивици,	m3	569,91	94,98	6 dys	Wed 2.5.18	Mon 7.5.18	17 674,81 лв.
500	Concrete kerbs and road strips	Бетонови бордюри и пътни ивици	m	3081,5	181,26	17 dys	Tue 8.5.18	Thu 24.5.18	82 227,40 лв.
501	Crushed stone (0-40) d= 30 cm	Несортиран трошен камък (0-40) d=30 см	m3	982,76	98,28	10 dys	Fri 25.5.18	Sun 3.6.18	32 768,68 лв.
502	Geogrid 55 kN/m	Геомрежа с якост 55 kN/m в двете посоки	m2	110,35	22,07	5 dys	Wed 2.5.18	Sun 6.5.18	0,00 лв.
503	Asphalt mixture laying on road - Bituminous crushed stone Ao	Полагане асфалт на пътя - Битумизиран трошен камък Ао	t	2202,68	550,67	4 dys	Fri 25.5.18	Mon 28.5.18	221 915,79 лв.
504	Asphalt mixture laying bituminous crushed stone Ao-sidewalks	Полагане асфалт битумизиран трошен камък Ао на тротоар	t	303,71	151,85	2 dys	Mon 4.6.18	Tue 5.6.18	30 757,23 лв.
505	Asphalt mixture laying on road - Binder	Полагане асфалт на пътя - Неплътен асфалтобетон	t	674,99	337,5	2 dys	Wed 6.6.18	Thu 7.6.18	74 673,33 лв.
506	Sidewalk tiles and paving-blocks	Тротоарни плочи и тротоарни павета	m2	687,24	85,91	8 dys	Wed 6.6.18	Wed 13.6.18	21 382,78 лв.
507	Geocomposite 50 kN/m in both directions	Геокомпозит с якост 50 kN/m в двете посоки	m2	1161	580,5	2 dys	Fri 8.6.18	Sat 9.6.18	8 045,73 лв.
508	Mound of sandy clay and humus for dividing strip and green areas	План за временна организация на движение на всички етапи		0	0	0 dys	Fri 25.5.18	Fri 25.5.18	0,00 лв.
509	Asphalt mixture laying on road - Dense asphalt concrete -split mastic with polymer-modified bitumen	Полагане асфалт на пътя - Плътен асфалтобетон -сплит мастик с полимер-модифициран битум	m2	26724	13362	2 dys	Fri 8.6.18	Sat 9.6.18	454 040,76 лв.
510	Embankment of sandy clay and greenery on the central reserve	Насип от песъчлива глина и хумус за разделителна ивица и зелени площи	m3	634,5	211,5	3 dys	Thu 14.6.18	Sat 16.6.18	8 957,85 лв.
511	Asphalt mixture laying dense asphalt concrete, type A - sidewalks	Полагане асфалт плътен асфалтобетон тип А на тротоар	m2	2072	1036	2 dys	Sun 17.6.18	Mon 18.6.18	23 444,90 лв.
512	Red asphalt mixture laying - Dense asphalt concrete, type A for bicycle lanes	Полагане оцветен червен асфалт - Плътен асфалтобетон тип А за велоалеи	m2	541,5	270,75	2 dys	Tue 19.6.18	Wed 20.6.18	15 842,64 лв.
513	Steel guard rail ЕПО 40 with driven posts	Стоманена предпазна ограда ЕПО 4.0 с набиване на с	m	120	24	5 dys	Thu 21.6.18	Mon 25.6.18	4 924,50 лв.
514	Sidewalk lattice railing with height of H = 810 mm	Тротоарен решетъчен парапет с височина H = 810 мм	m	377	125,67	3 dys	Thu 21.6.18	Sat 23.6.18	17 253,45 лв.
515	Road signs and road marking	Стандартни рефлекторни пътни знаци	lump	1	0,33	3 dys	Sun 24.6.18	Tue 26.6.18	38 308,48 лв.
516	**PART WSS**	**ЧАСТ ВИК**		**0**		**17 dys**	**Fri 30.3.18**	**Sun 15.4.18**	**80 575,56 лв.**
517	**DRAINAGE**	**ОТВОДНЯВАНЕ**		**0**		**17 dys**	**Fri 30.3.18**	**Sun 15.4.18**	**80 575,56 лв.**
518	Excavation of channel, installation of pipes and backfilling	Изкоп на канал за доставка и монтаж на тръби и обратно засипване	m	315,5	21,03	15 dys	Fri 30.3.18	Fri 13.4.18	80 575,56 лв.
519	Surveying and testing of sewage	Заснемане и изпитване на канализация	m	338	169	2 dys	Sat 14.4.18	Sun 15.4.18	0,00 лв.
520	**PART ELECTROTECHNICAL**	**ЧАСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА**		**0**		**79 dys**	**Mon 16.4.18**	**Tue 3.7.18**	**341 533,82 лв.**
521	Street lignthing	Изграждане на кабелни трасета	lump	1	0,1	10 dys	Wed 2.5.18	Fri 11.5.18	18 156,00 лв.
522	Installation of poles	Монтаж на стълбове	lump	0	0	5 dys	Tue 19.6.18	Sat 23.6.18	18 156,00 лв.
523	Installation of cables and fixtures	Монтаж на кабели и осветителни тела	lump	0	0	5 dys	Sun 24.6.18	Thu 28.6.18	18 156,00 лв.
524	Pipe-Channel network and moving of existing equipment	Тръбна канална мрежа и изместване на съществуващи съоръжения	m	340	21,25	16 dys	Mon 16.4.18	Tue 1.5.18	251 238,41 лв.
525	Traffic lights at km 0+762.85	Светофарна уредба на км. 0+762.85	lump	1	0,2	5 dys	Sun 24.6.18	Thu 28.6.18	35 827,41 лв.
526	Cleaning of the construction site	Почистване на строителната площ		0	0	5 dys	Fri 29.6.18	Tue 3.7.18	0,00 лв.
527	**TAKING OVER**	**ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДАВАНЕ НА УЧАСТЪКА**		**0**		**54 dys**	**Fri 25.5.18**	**Tue 17.7.18**	**0,00 лв.**
528	Built in drawings	Изготвяне екзекутивни чертежи		0		40 dys	Fri 25.5.18	Tue 3.7.18	0,00 лв.
529	Notice of completiton of works	Известие за завършване на работата		0		0 dys	Wed 13.6.18	Wed 13.6.18	0,00 лв.
530	Testing for taking over	Проверки преди приемането		0		14 dys	Wed 4.7.18	Tue 17.7.18	0,00 лв.
531	Taking over certificate	Заключителен сертификат		0		0 dys	Tue 17.7.18	Tue 17.7.18	0,00 лв.
532	**Construction works of Severen Blvd**	**Строителни работи на на бул „Северен"**		**0**		**914 dys**	**Sun 15.1.17**	**Wed 17.7.19**	**8 546 662,63 лв.**
533	**Reconstruction of severen blvd in the section from adata bridge to karlovsko shose / first phase: severen blvd from adata bridge to brezovsko shose including the intersection /**	**Реконструкция на бул "северен" в участъка от моста на "адата" до "карловско шосе" първи етап: булевард " северен " от моста на адата до брезовско шосе вкл кръстовище**		**0**		**914 dys**	**Sun 15.1.17**	**Wed 17.7.19**	**8 546 662,63 лв.**
534	**PART ROAD**	**ЧАСТ ПЪТНА**		**0**		**860 dys**	**Sun 15.1.17**	**Fri 24.5.19**	**5 519 054,64 лв.**
535	Design of TTO and notice of work beggining	Известие за започване на работа		0		0 dys	Sun 15.1.17	Sun 15.1.17	0,00 лв.
536	Access to the site (Protokol 2a)	Достъп до строителната площадка (Протокол 2а)		0		0 dys	Wed 1.2.17	Wed 1.2.17	0,00 лв.
537	<New Task>	ВОД		0	0	2 dys	Wed 1.2.17	Thu 2.2.17	0,00 лв.
538	<New Task>	Пътни знаци		0	0	2 dys	Fri 3.2.17	Sat 4.2.17	0,00 лв.
539	Cleaning of the construction site and mobilization	Почистване на строителната площадка и мобилизация	m2	4850	173,21	28 dys	Sun 5.2.17	Sat 4.3.17	20 540,32 лв.
540	Removal of vegetation -trees and bushes	Отстраняване на растителност - дърветa и храсти	pcs	4632	165,43	28 dys	Sun 5.2.17	Sat 4.3.17	28 244,68 лв.
541	Removal of humus with transportation to a landfill site	Отстраняване на хумус с превоз на депо	m3	4800	171,43	28 dys	Sun 5.2.17	Sat 4.3.17	47 813,32 лв.
542	Demounting of traverses	Демонтаж на траверси	m	943	47,15	20 dys	Sun 5.3.17	Fri 24.3.17	22 613,36 лв.
543	Breaking up of sidewalk pavement	Разкъртване на тротоарна настилка	m2	1070	53,5	20 dys	Sat 25.3.17	Thu 13.4.17	21 657,92 лв.
544	Breaking up of concrete curbs 18/35	Разкъртване на бетонови бордюри 18/35	m	302	30,2	10 dys	Sun 5.3.17	Tue 14.3.17	18 931,72 лв.
545	Demolition of garden curbs	Разрушаване на градински бордюри	m	380	76	5 dys	Sun 5.3.17	Thu 9.3.17	19 493,32 лв.
546	Breaking up of existing asphalt concrete pavement	Разкъртване на съществуваща асфалтобетонова наст	m3	1568	156,8	10 dys	Tue 4.4.17	Thu 13.4.17	50 532,04 лв.
547	Excavation of unacceptable material	Изкоп неподходящ материал	m3	68290	682,9	100 dys	Sun 9.4.17	Mon 17.7.17	501 616,32 лв.
548	Profiling of the earth bed	Профилиране на земното легло	m2	39979	1332,63	30 dys	Fri 23.3.18	Sat 21.4.18	16 757,32 лв.
549	Embankment from crushed stone	Насип от несортиран трошен камък	m3	23481	293,51	80 dys	Sun 22.4.18	Tue 10.7.18	724 604,60 лв.
550	Placing of concrete strips, concrete curbs	Полагане на бетонови ивици, бетонови бордюри	m	9200	65,71	140 dys	Sat 14.7.18	Fri 30.11.18	247 724,48 лв.
551	Asphalt mixture laying on road - Asphalt mixture for base layers type Ao	Полагане асфалт на пътя - Асфалтова смес за основни пластове тип "Ао"	t	15322	510,73	30 dys	Sat 1.12.18	Sun 30.12.18	1 554 632,38 лв.
552	Asphalt mixture laying on road - Asphalt mixture for the lower layer of the surfacing (binder)	Полагане асфалтова смес за долен пласт на покритието (неплътен асфалтобетон)	t	7978	265,93	30 dys	Fri 1.3.19	Sat 30.3.19	871 551,40 лв.
553	Asphalt mixture laying on road - Dense asphalt concrete type A with polymer-modified bitumen	Полагане асфалт на пътя - Плътен асфалтобетон тип "А" с полимермодифициран битум	m2	39979	1332,63	30 dys	Sun 31.3.19	Mon 29.4.19	584 858,92 лв.
554	Execution of sidewalk pavement of concrete tiles 40/40/5 and tactile tiles	Направа на тротоарна настилка от бет. плочи 40/40/5 и тактилни плочи	m2	15221	101,47	150 dys	Sat 14.7.18	Mon 10.12.18	511 636,46 лв.
555	Guardrail ЕПОС, pipe-lattice railing	Предпазна ограда ЕПОС, тръбно решетъчен парапет	m	2661,5	66,54	40 dys	Fri 5.4.19	Tue 14.5.19	226 603,14 лв.
556	Road signs and road marking	Стандартни рефлекторни пътни знаци	lump	1	0,1	10 dys	Wed 15.5.19	Fri 24.5.19	49 242,94 лв.
557	**PART WSS**	**ЧАСТ ВИК**		**0**		**343 dys**	**Fri 14.4.17**	**Thu 22.3.18**	**2 197 388,96 лв.**
558	**WSS (SEWAGE) - PHASE I /**	**ВИК (КАНАЛИЗАЦИЯ) - ЕТАП 1**		**0**		**343 dys**	**Fri 14.4.17**	**Thu 22.3.18**	**1 212 438,94 лв.**
559	Excavation of channel, installation of pipes (corrugated PP pipes) and backfilling	Изкоп на канал за доставка и монтаж на траби (ВЪЛНООБРАЗНИ PP ТРЪБИ) и обратно засипване	lump	1	0	303 dys	Fri 14.4.17	Sat 10.2.18	1 128 938,90 лв.
560	Drainage works with a section of the excavation of 40/40 with corrugated PE-HD 110	Дренаж със сечение на изкопа 40/40 с перфориран PE-HD 110	m	2948	73,7	40 dys	Sun 11.2.18	Thu 22.3.18	83 500,04 лв.
561	**WSS (WATER MAIN) - PHASE I /**	**ВИК (ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД) - ЕТАП 1**		**0**		**300 dys**	**Wed 19.4.17**	**Mon 12.2.18**	**984 950,02 лв.**
562	Excavation of channel, installation of pipes (pipes ПЕВП; cast-iron socket pipes) and backfilling	Изкоп на канал за доставка и монтаж на тръби (тръба ПЕВП; чугунени муфени тръби) и обратно засипване	lump	1		300 dys	Wed 19.4.17	Mon 12.2.18	903 506,70 лв.
563	**IRRIGATION WATER CONDUIT**	**ПОЛИВЕН ВОДОПРОВОД**		**0**		**100 dys**	**Wed 19.4.17**	**Thu 27.7.17**	**81 443,32 лв.**
564	Excavation of channel, installation of pipes (Pipe ПЕВП; Drip irrigation hoses; Steel pipes) and backfilling	Изкоп на канал за доставка и монтаж на тръби (Тръба ПЕВП; Капкови маркучи; Стоманени тръби) и обратно засипване	lump	1		100 dys	Wed 19.4.17	Thu 27.7.17	81 443,32 лв.
565	**PART ELECTROTECHNICAL**	**ЧАСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА**		**0**		**806 dys**	**Wed 19.4.17**	**Wed 3.7.19**	**830 219,03 лв.**
566	Pipe-Channel network and moving of existing equipment	Тръбна канална мрежа и изместване на съществуващи съоръжения	m	1760	8	220 dys	Wed 19.4.17	Fri 24.11.17	513 102,96 лв.
567	<New Task>	Монтаж на кабелни трасета	lump	0	0	50 dys	Tue 11.12.18	Tue 29.1.19	82 924,05 лв.
568	<New Task>	Монтаж на стълбове	lump	0	0	50 dys	Wed 30.1.19	Wed 20.3.19	82 924,05 лв.
569	Street lignthing	Монтаж на кабели и осветителни тела	lump	1	0,02	50 dys	Thu 21.3.19	Thu 9.5.19	82 924,05 лв.
570	Traffic lights	Светофарна уредба	lump	1	0,03	40 dys	Fri 10.5.19	Tue 18.6.19	68 343,92 лв.
571	Cleaning of the construction site	Почистване на строителната площ		0	0	15 dys	Wed 19.6.19	Wed 3.7.19	0,00 лв.
572	**TAKING OVER**	**ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДАВАНЕ НА УЧАСТЪКА**		**0**	**0**	**104 dys**	**Fri 5.4.19**	**Wed 17.7.19**	**0,00 лв.**
573	Built in drawings	Изготвяне екзекутивни чертежи		0		90 dys	Fri 5.4.19	Wed 3.7.19	0,00 лв.
574	Notice of completition of works	Известие за завършване на работата		0		0 dys	Thu 13.6.19	Thu 13.6.19	0,00 лв.
575	Testing for taking over	Проверки преди приемането		0		14 dys	Thu 4.7.19	Wed 17.7.19	0,00 лв.
576	Taking over certificate	Заключителен сертификат		0		0 dys	Wed 17.7.19	Wed 17.7.19	0,00 лв.
577	**TAKING OVER CERTIFICATE PROEKT**	**СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА**		**0**		**0 dys**	**Wed 17.7.19**	**Wed 17.7.19**	**0,00 лв.**
